



องค์ความรู้ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การรายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบฐานข้อมูล การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง CM



การจัดการความรู้ ตามภารกิจด้านการบริการด้านช่าง

องค์ความรู้ตามภารกิจ ด้านการบริการด้านช่าง

ดำเนินการจัดทำตามแผนการจัดการความรู้กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT KM Action Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

| | |
|-----------------|---|
| โดย | กองควบคุมการก่อสร้าง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๑๕ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๑๐ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๘ |
| พิมพ์ครั้งที่ ๑ | มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐ เล่ม |
| พิมพ์ที่ | บริษัท พรอสเปอร์ เอ็ม จำกัด โทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๒๖ ๓๕๕๑ โทรสาร ๐ ๒๗๒๖ ๘๓๙๑ |

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาต
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย



องค์ความรู้ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การรายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบฐานข้อมูล การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง CM



การจัดการความรู้ ตามภารกิจด้านการบริการด้านช่าง

สารบัญ

| | |
|---|---------|
| บทนำ | 1 - 4 |
| บทที่ 1 ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) | 5 |
| บทที่ 2 ขั้นตอนสำหรับผู้บริหาร | |
| 2.1 ภาพรวมความก้าวหน้า | 7 |
| 2.2 งานที่ช้ากว่าแผน | 8 |
| 2.3 งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค | 9 |
| 2.4 งานที่แล้วเสร็จ | 10 |
| 2.5 การส่งรายงานประจำสัปดาห์ | 11 |
| 2.6 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ | 12 - 13 |
| 2.7 จำนวนงานแยกตามจังหวัด | 14 |
| 2.8 จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน | 15 |
| บทที่ 3 ขั้นตอนสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | |
| 3.1 รายงานประจำวัน | 16 - 20 |
| บทที่ 4 ขั้นตอนสำหรับแอดมิน/ธุรการ | |
| 4.1 จัดการโครงการ | 22 - 28 |
| 4.2 รายงานประจำวัน | 29 |
| 4.3 ภาพการส่งงวดงาน | 30 |
| 4.4 สัญญาจ้างโครงการ | 31 |
| 4.5 แบบก่อสร้าง | 32 |
| 4.6 ภาพรวมความก้าวหน้า | 33 |
| 4.7 งานที่ช้ากว่าแผน | 34 |
| 4.8 งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค | 35 |
| 4.9 งานที่แล้วเสร็จ | 36 |
| 4.10 การส่งรายงานประจำสัปดาห์ | 37 |
| 4.11 ค้างรายงาน | 38 |
| 4.12 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ | 39 - 40 |
| 4.13 จำนวนงานแยกตามจังหวัด | 41 |
| 4.14 จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน | 42 |

สารบัญ (ต่อ)

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 4.15 Report | 43 |
| 4.16 จัดการสิทธิ์เข้าถึง | 44 |
| 4.17 ข้อมูลหลัก | 45 - 70 |
| บทที่ 5 ขั้นตอนสำหรับผู้ควบคุมงาน | |
| 5.1 รายงานประจำวัน | 71 - 83 |
| 5.2 สัญญาจ้างโครงการ | 84 |
| 5.3 แบบก่อสร้าง | 85 |
| 5.4 การส่งรายงานประจำสัปดาห์ | 86 |
| 5.5 ค้างรายงาน | 87 |
| บทที่ 6 บทสรุป | 88 - 89 |

บทนำ

ปัจจุบันนี้ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาช่วยในการจัดการและบริหารงานควบคุมงานก่อสร้าง คือ ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management, CM) เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลการก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยผู้ควบคุมงานสามารถจัดทำและนำส่งรายงานความก้าวหน้าผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน ผ่านโน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อันเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ในการเข้าถึงข้อมูลภาคสนามและช่วยในการบริหารและจัดการโครงการก่อสร้างและการบริหารงบประมาณภาครัฐ

ผู้ใช้งานทุกระดับ ทั้งแอดมิน ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้บริหาร ต้องเข้าใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) จะต้องมีความรู้ในการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ควบคุมงาน ในการรายงานผลงานก่อสร้างให้มีความรวดเร็ว เกิดประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างและก่อประโยชน์แก่ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ บริหารสัญญาและงบประมาณของรัฐ ต่อไป

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระบุ หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ดังนี้

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(3) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

(4) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

และระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(4) นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด


(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ แล้วแต่กรณี

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (6)

จากหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเห็นได้ว่า การรายงานผลงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญมาก ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ผลงานก่อสร้างความถูกต้องของงานก่อสร้างตรงตามรูปแบบในสัญญา หรือในกรณีรูปแบบไม่เป็นไปตามรูปแบบในหลักวิชาการช่างมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ เพราะฉะนั้นการที่มีระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผู้บริหาร/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถกำกับ ติดตาม และบริหารสัญญาจ้าง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การใช้งานระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องเข้าใจกระบวนการของระบบดังแสดงในรูปที่ 1

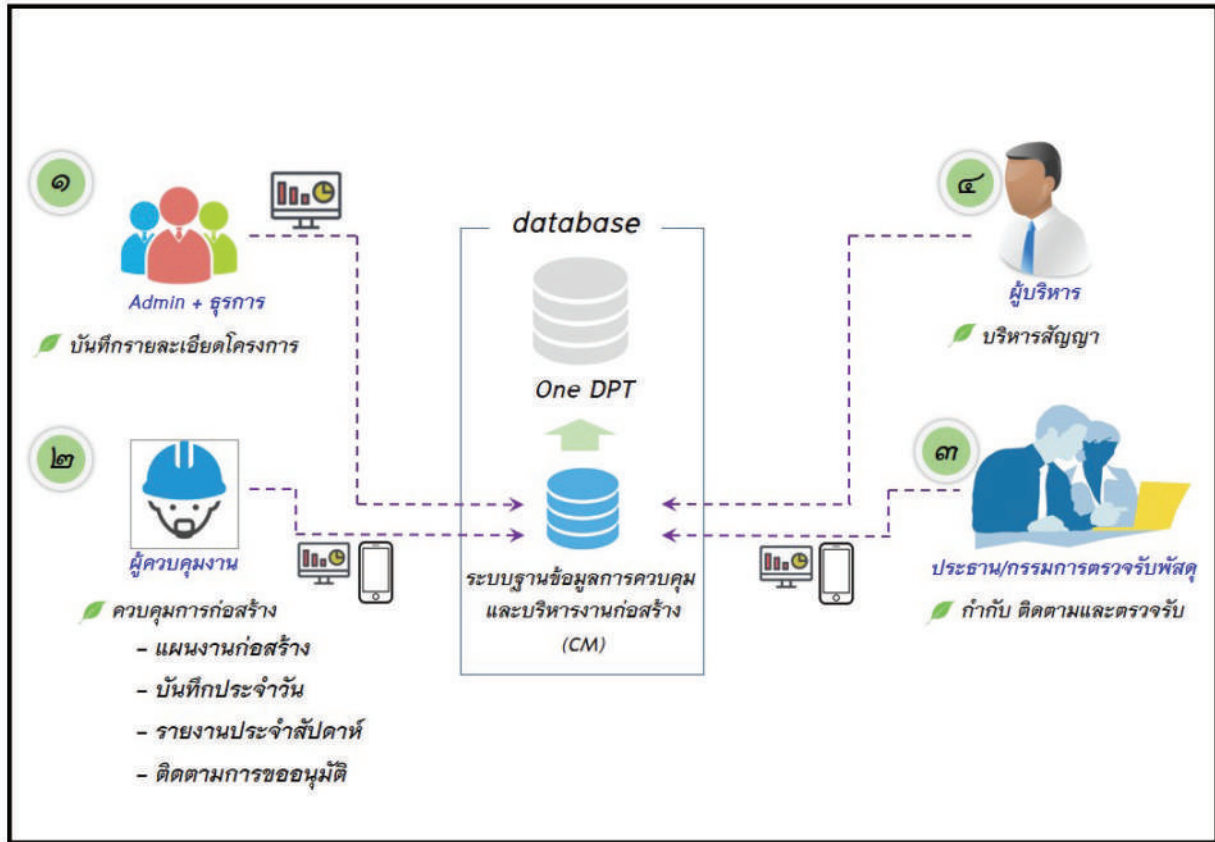

รูปที่ 1 กระบวนการของระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานและแอดมิน/ธุรการ จะเป็นผู้นำส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้บริหารจะเป็นผู้ดึงข้อมูลระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) มาใช้งาน ฉะนั้น ทั้ง 4 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และแอดมิน/ธุรการ จำเป็นต้องศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ให้เข้าใจและฝึกฝนการใช้งานบ่อย ๆ จะเกิดความชำนาญ (Skill) และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ในเล่มนี้ ประกอบด้วย 6 บท คือ


- บทที่ 1 ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)
- บทที่ 2 ขั้นตอนสำหรับผู้บริหาร
- บทที่ 3 ขั้นตอนสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- บทที่ 4 ขั้นตอนสำหรับแอดมิน/ธุรการ
- บทที่ 5 ขั้นตอนสำหรับผู้ควบคุมงาน
- บทที่ 6 บทสรุป

บทที่ 1


ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการเข้าระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 5 ข้อ ดังนี้

1. ไปที่เบราว์เซอร์  ใน Notebook หรือ PC
2. พิมพ์ <http://onedpt.dpt.go.th>
3. คลิกเลือก  ปุ่ม “ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)”



4. กรอก รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่กองควบคุมการก่อสร้างจัดให้



5. คลิกเลือกปุ่มสีชมพู “เข้าสู่ระบบ”

บทที่ 2

ขั้นตอนสำหรับผู้บริหาร

หลังจากใส่ รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบ (ตามที่ระบุไว้ บทที่ 1) จะปรากฏเมนู ดังนี้

เมนูของผู้บริหาร



เมนูจะแบ่งออกเป็น 8 เมนูย่อย ประกอบไปด้วย

- 1) ภาพรวมความก้าวหน้า
- 2) งานที่ช้ากว่าแผน
- 3) งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค
- 4) งานที่แล้วเสร็จ
- 5) การส่งรายงานประจำสัปดาห์
- 6) ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
- 7) จำนวนงานแยกตามจังหวัด
- 8) จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน

1. เมื่อกดคลิกที่ ภาพรวมความก้าวหน้า



การสืบค้นข้อมูล โครงการ “ภาพรวมความก้าวหน้า” จาก 3 แหล่ง จะปรากฏภาพ คือ

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ค่าเริ่มต้นจะปรากฏเป็นปีปัจจุบัน)
- (2) สถานะโครงการ > เลือกสถานะ (กำลังดำเนินการ เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏภาพกราฟวงกลม 7 ภาพ แยกเป็น

- โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
- โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำระหว่างประเทศ
- โครงการระบบป้องกันน้ำท่วม
- โครงการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเมือง
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
- โครงการอื่น ๆ
- งานบริการควบคุมงาน

2. เมื่อกดคลิกที่ งานที่ช้ากว่าแผน



งานที่ช้ากว่าแผน


รายการโครงการที่ช้ากว่าแผน

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---|--------------|---------------|---|-----------|---------------|
| 1 | คำค้น | | 2 | ขอบประมาณ | -- ทั้งหมด -- | 3 | ลักษณะงาน | -- ทั้งหมด -- |
| 4 | การกำกับงาน | กองควบคุมการก่อสร้าง | 5 | ผู้ควบคุมงาน | -- ทั้งหมด -- | | | ค้นหา |

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 267 รายการ

1. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบ้านท่าแก้ง ม. 9 ตำบลหนองเรือ อ. 8 จ.ชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง บ้านเบรว่า อียุกอ
ผู้รับจ้าง ค่าคงที่แบบวงจำกัด อนุชกรวางพาณิชย์
งบประมาณ 20,450,000 บาท สัญญาเลขที่ 79/2558
ระยะเวลา 14/11/2557 - 12/07/2563
แผนงาน 100 % ผลจ่าย 95.72 % สอบการรายงาน วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2563
งวดงาน 35 สิ้นแล้ว 29



ล่าช้า 4.28 %

การสืบค้นข้อมูล โครงการ “งานที่ช้ากว่าแผน” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำ โขง แม่น้ำชี
- (2) ขอบประมาณ > เลือกขอบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ผู้ควบคุมงาน > เลือกรายชื่อ

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ งานที่ช้ากว่าแผน

ดังภาพด้านบนด้านขวา **ล่าช้า 4.28 %** (ตัวอักษรสีแดง)

3. เมื่อกดคลิกที่ งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค



งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค

รายการโครงการ/สิ่งปลูกสร้าง

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---|--------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | คำค้น | | 2 | ปีงบประมาณ | -- ทั้งหมด -- | 3 | ลักษณะงาน | -- ทั้งหมด -- |
| 4 | การกำกับงาน | กองควบคุมการก่อสร้าง | 5 | ผู้ควบคุมงาน | -- ทั้งหมด -- | <input type="text"/> ค้นหา | | |

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 80 รายการ

1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด ระบบไฟฟ้าอาคารรัชดาภิเษก
 พระนคร กรุงเทพมหานคร
 ผู้รับจ้าง การไฟฟ้าส่วนหลวง
 งบประมาณ 48,827,853 บาท สัญญาเลขที่ 904/2554
 ระยะเวลา 05/01/2555 - 29/03/2556
 แผนงาน 99.99 % ผลงาน 100 % สมุดการรายงาน วันที่ 24 - สิ้นเดือน สิงหาคม 2563
 งวดงาน 0 ส่งแล้ว 0
[หยุดงานด้วยสาเหตุ](#)

การสืบค้นข้อมูล โครงการ “งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโจง แม่น้ำจี้
- (2) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ผู้ควบคุมงาน > เลือกผู้ควบคุมงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค

ดังภาพด้านบน ด้านขวามือ มีเครื่องหมายหยุด (สีแดง)

4. เมื่อกดที่ งานที่แล้วเสร็จ



งานที่แล้วเสร็จ

รายการโครงการที่แล้วเสร็จ

1 คำค้น 2 ปีงบประมาณ -- ทั้งหมด -- 3 ลักษณะงาน -- ทั้งหมด --

4 การกำกับงาน กองควบคุมการก่อสร้าง 5 ผู้ควบคุมงาน -- ทั้งหมด -- 🔍 🗖 🔍 ค้นหา

แสดงรายการที่ 1 ถึง 18 จาก 18 รายการ

1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปากห้วยม่วง หมู่ 2 (ต่อเมืองเดือนเดิมปี 57 เหมื่อน้ำ) อ.เมือง จ.นครพนม

เมืองนครพนม นครพนม
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน จำกัด 57
งบประมาณ 81,490,000 บาท สัญญาเลขที่ 226/2559
รพช.เวลา 18/04/2559 - 07/05/2562
แผนงาน 99 99 % ผลงาน 100 % รอบการรายงาน วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
จวตงาน 210 ล่องเรือ 0 5/15/รายงาน 16/02/2562
แล้วเสร็จ(คณะกรรมการตรวจรับแล้ว) 3ปี

การสืบค้นข้อมูล โครงการ “งานที่แล้วเสร็จ” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้


- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำจี้
- (2) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ผู้ควบคุมงาน > เลือกผู้ควบคุมงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

🔍 ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ งานที่แล้วเสร็จ

5. เมื่อกดคลิกที่ การส่งรายงานประจำสัปดาห์



| รายงานการส่งงาน | | | |
|-----------------|--------------------|-------------|---------|
| 1 | ปีที่ยังงาน | -- คือกด -- | ▼ |
| 2 | เดือน | สิงหาคม | ▼ |
| 3 | ประเภทผู้ควบคุมงาน | -- คือกด -- | ▼ |
| 4 | ผู้ควบคุมงาน | | Q ค้นหา |

การสืบค้นข้อมูลโครงการ “การส่งรายงานประจำสัปดาห์” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- (1) ปีที่ยังงาน > เลือกปีที่ยังงาน (ทั้งหมด จะเป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) เดือน > เลือกเดือน (เดือนปัจจุบัน จะเป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) ผู้ควบคุมงาน > ใส่ชื่อผู้ควบคุมงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด การส่งรายงานประจำสัปดาห์

6. เมื่อกดที่ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ



| GIS Monitor - งานโครงการที่ดินสีชมพู | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|---|------------------|--------------------|----|--------------------|---------------------|--|
| 1 | ขอบประมาณ | -- ทั้งหมด -- | 2 | สถานะ | ยังไม่สิ้นสุดสัญญา | 3 | ประเภทผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน (กคส.) | |
| 4 | ลักษณะงาน | -- ทั้งหมด -- | | | | | | | |
| 5 | โครงการ | -- กรุณาเลือก -- | 6 | เส้นรุ้ง ละติจูด | | 7 | เส้นแวง ลองจิจูด | | |
| 8 | จังหวัด | -- กรุณาเลือก -- | 9 | อำเภอ/เขต | -- กรุณาเลือก -- | 10 | ตำบล/แขวง | -- กรุณาเลือก -- | |
| 🔍 ค้นหา | | | | | | | | | |

การสืบค้นข้อมูลโครงการ “ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ” แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

วิธีที่ 1 เลือกจาก 10 แหล่งข้อมูล


- (1) ปิงบประมาณ > เลือกปิงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) สถานะ > เลือกสถานะ (ยังไม่สิ้นสุดสัญญา เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน กคส. เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) โครงการ > เลือกโครงการ
- (6) เส้นรุ้ง ละติจูด > ใส่ค่า ละติจูด
- (7) เส้นแวง ลองจิจูด > ใส่ค่า ลองจิจูด
- (8) จังหวัด > เลือกจังหวัด
- (9) อำเภอ/เขต > เลือกอำเภอ/เขต
- (10) ตำบล/แขวง > เลือกตำบล/แขวง

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

🔍 ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียด ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

วิธีที่ 2 เลือกจากรายชื่อผู้ควบคุมงาน

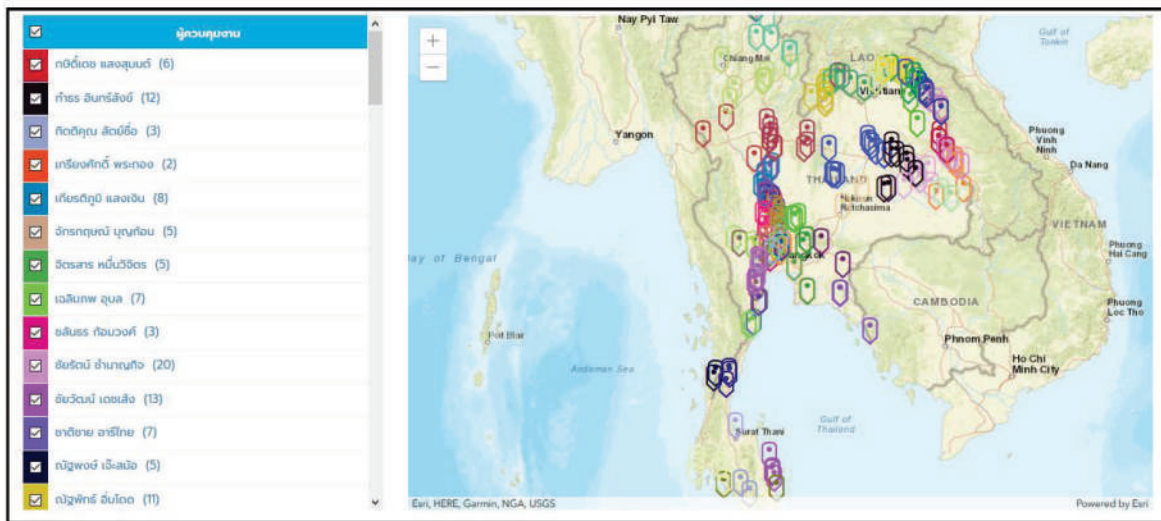

ทำเครื่องหมาย หน้ารายชื่อผู้ควบคุมงาน จะแสดงโครงการด้านขบวนการในพื้นที่
(โดยมีรายชื่อผู้ควบคุมงานทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น)

7. เมื่อกดคลิกที่ จำนวนงานแยกตามจังหวัด



จำนวนงานแยกตามจังหวัด

1 ชื่อประเภท -- ก่อสร้าง -- 2 สถาน-โครงการ กำลังดำเนินการ 3 การกำกับงาน กองควบคุมการก่อสร้าง

จำนวนงานแยกตามจังหวัดทั้งหมด รวม 302 โครงการ

| ลำดับ | จังหวัด | โครงการเริ่มเปิดรับ คำสั่งซื้อเมื่อ ภาคใต้ | โครงการเริ่มเปิดรับ คำสั่งซื้อเมื่อ ตะวันออกเฉียงใต้ | โครงการเริ่มเปิดรับ คำสั่งซื้อเมื่อ ภาคเหนือ | โครงการพัฒนาพื้นที่ และดินนาเมือง | โครงการร่วมแบบ และปรับปรุง | งานสืบเสาะงานช่าง (รวมงานซ่อมแซม) | โครงการอื่นๆ | รวม |
|-------|---------------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| 1 | กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | กำแพงเพชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

การสืบค้นข้อมูล โครงการ “จำนวนงานแยกตามจังหวัด” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) สถานะ โครงการ > เลือกสถานะ (กำลังดำเนินการ เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียด จำนวนงานแยกตามจังหวัด

8. เมื่อกดคลิกที่ จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน



จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน

1 ปีงบประมาณ -- ทั้งหมด -- 2 สถานะโครงการ -- ทั้งหมด -- 3 ประเภทผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน (กคส.) Q ค้นหา

จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงานทั้งหมด 526 95 คน

| ลำดับ | ผู้ควบคุมงาน | โครงการเริ่มต้น จังหวัด เชียงใหม่ ภายในประเทศ | โครงการเริ่มต้น จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างประเทศ | โครงการระบบ จังหวัด เชียงใหม่ | โครงการพัฒนา พื้นที่ และสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซม และปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง | งานให้บริการด้าน ช่างต่าง (ควบคุมงานของ หน่วยงานอื่น) | โครงการอื่นๆ | รวม |
|-------|----------------------|--|--|-------------------------------------|---|--|--|--------------|-----|
| 1 | กวีรัตน์ หลงสุนนดี | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | กอบชนนวิทย์ รัตติกุล | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | กัษณ อิมภรสิงห์ | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | กิตติคุณ สัตย์ดี | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | เกษียรศักดิ์ พรหมทอง | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

การสืบค้นข้อมูลโครงการ “จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ
- (2) สถานะ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน กคส. เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

Q ค้นหา


จะปรากฏรายละเอียด จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน

บทที่ 3


ขั้นตอนสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หลังจากใส่ รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบ (ตามที่ระบุไว้ บทที่ 1) จะปรากฏเมนู ดังนี้

เมนูของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



1. ในหน้ารายงานประจำวัน จะแสดงโครงการทั้งหมดที่เข้าของรหัสผู้ใช้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในกรอบสีน้ำเงิน ดังรูปภาพด้านล่าง

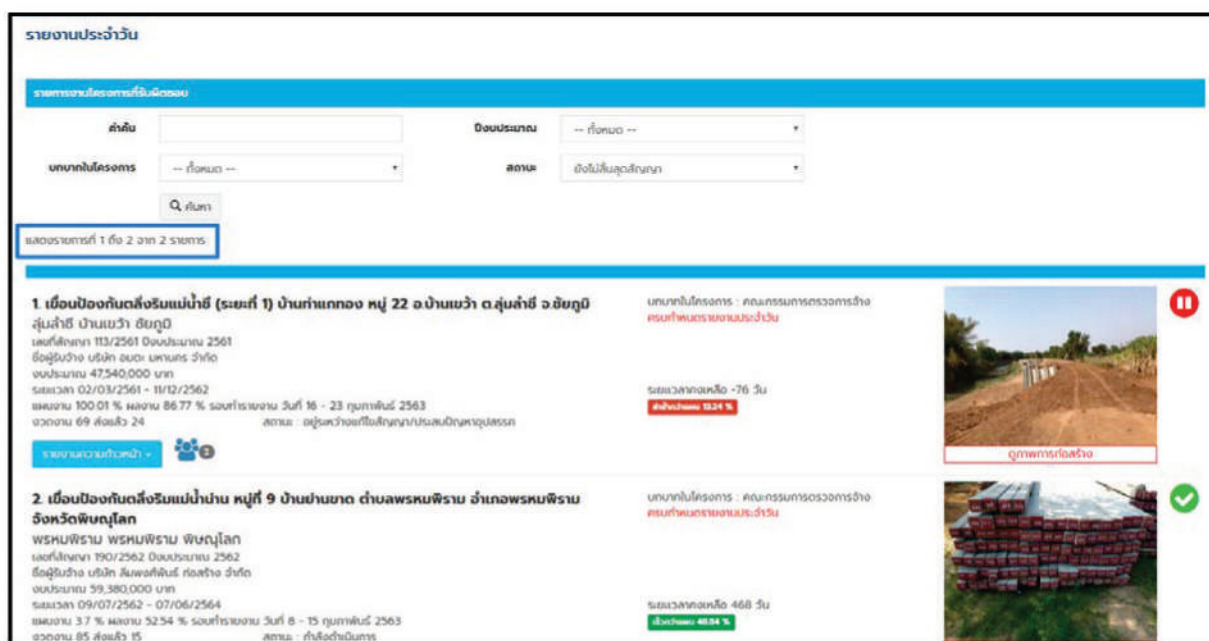A screenshot of the 'รายงานประจำวัน' (Daily Work Report) page. The page has a blue header with the title 'รายงานประจำวัน'. Below the header, there are several input fields for filtering: 'คำค้น', 'เดือนประมาณ', 'ประเภทโครงการ', and 'สถานะ'. A search button 'ค้นหา' is also present. Below the search fields, there are two project cards. The first card is titled '1. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ (ระยะที่ 1) บ้านท่าทอง หมู่ 22 อ.บ้านบัว อ.ชัยภูมิ' and shows details like 'เลขที่สัญญา 113/2561', 'งบประมาณ 2561', and 'สัญญาจ้าง บริษัท ออซี เทคโนโลยี จำกัด'. It also includes a photo of a construction site and a red 'ปิด' (Close) button. The second card is titled '2. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านยาว ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก' and shows details like 'เลขที่สัญญา 190/2562', 'งบประมาณ 2562', and 'สัญญาจ้าง บริษัท สิวพงศ์สินธ์ก่อสร้าง จำกัด'. It includes a photo of construction materials and a green checkmark icon.

- ข้อมูลแต่ละโครงการจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ เช่น ชื่อโครงการ, เลขที่สัญญา, งบประมาณ, ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง, มูลค่าโครงการ, วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุด, แผนงาน, ผลงาน, รอบการทำรายงาน, งวดงาน, สถานะโครงการ (กำลังดำเนินการ, แก้ไขสัญญา), รูปภาพการก่อสร้าง ดังรูปภาพด้านล่าง

รายงานประจำวัน

ประเภทโครงการที่เลือกพบ

ค้นหา

ประเภทโครงการ -- ทั้งหมด --

สถานะ ยังไม่สิ้นสุดสัญญา

แสดงรายการที่ 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

1. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 1) บ้านท่าแกทอง หมู่ 22 อ.บ้านเขวาสี อ.อียภูมิ

บ้านท่าแกทอง หมู่ 22 อ.บ้านเขวาสี อ.อียภูมิ

เลขที่สัญญา 113/2561 งบประมาณ 2561

ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท อเนก บิโกล จำกัด

งบประมาณ 47,540,000 บาท

ระยะเวลา 02/03/2561 - 11/12/2562

แผนงาน 100.01 % ผลงาน 86.77 % รอบทำรายงาน วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

งวดงาน 09 สิ้นแล้ว 24

สถานะ : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ปรับสเปคสัญญา/ปรับราคา

ประเภทโครงการ : คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ครบกำหนดรายงานประจำวัน

ระยะเวลาคงเหลือ -76 วัน

สถานะ: **หยุด** 0.24 %

2. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านขาด ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

เลขที่สัญญา 190/2562 งบประมาณ 2562

ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท สิบสองปันนา จำกัด

งบประมาณ 59,380,000 บาท

ระยะเวลา 09/07/2562 - 07/06/2564

แผนงาน 3.7 % ผลงาน 52.54 % รอบทำรายงาน วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

งวดงาน 85 สิ้นแล้ว 15

สถานะ : กำลังดำเนินการ

ประเภทโครงการ : คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ครบกำหนดรายงานประจำวัน

ระยะเวลาคงเหลือ 468 วัน

สถานะ: **ดำเนินการ** 48.84 %



ปุ่มเครื่องหมายหยุด (สีแดง) ในกรอบสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการสั่งหยุดงาน (อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค)



ปุ่มเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ในกรอบสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

- รูปภาพความก้าวหน้างานแต่ละเดือน : กรอบสีน้ำเงินได้รูป
 - คลิกดูรูปภาพการก่อสร้าง จะแสดงภาพเพิ่มเติม
 - จะแสดงรูปถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในแต่ละเดือนตามตำแหน่งที่กำหนดไว้

2. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านท่าแกทอง ม. 9 ตำบลท่าแกทอง อ. 8 อ.อียภูมิ

บ้านท่าแกทอง หมู่ 9 ตำบลท่าแกทอง อ. 8 อ.อียภูมิ

เลขที่สัญญา 79/2558 งบประมาณ 2557

ชื่อผู้รับจ้าง ฟังจันท์อเนก จำกัด บุญกรวีงพาณิชย์

งบประมาณ 20,450,000 บาท

ระยะเวลา 14/11/2557 - 12/07/2563

แผนงาน 100 % ผลงาน 95.72 % รอบทำรายงาน วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2563

งวดงาน 35 สิ้นแล้ว 29

สถานะ : กำลังดำเนินการ


ประเภทโครงการ : คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ระยะเวลาคงเหลือ -3 วัน


สถานะ: **ดำเนินการ** 4.28 %

ดูแผนผัง - รายงานความก้าวหน้า - ตรวจสอบบัญชี พิมพ์เอกสารตรวจบัญชี

ดูภาพการก่อสร้าง

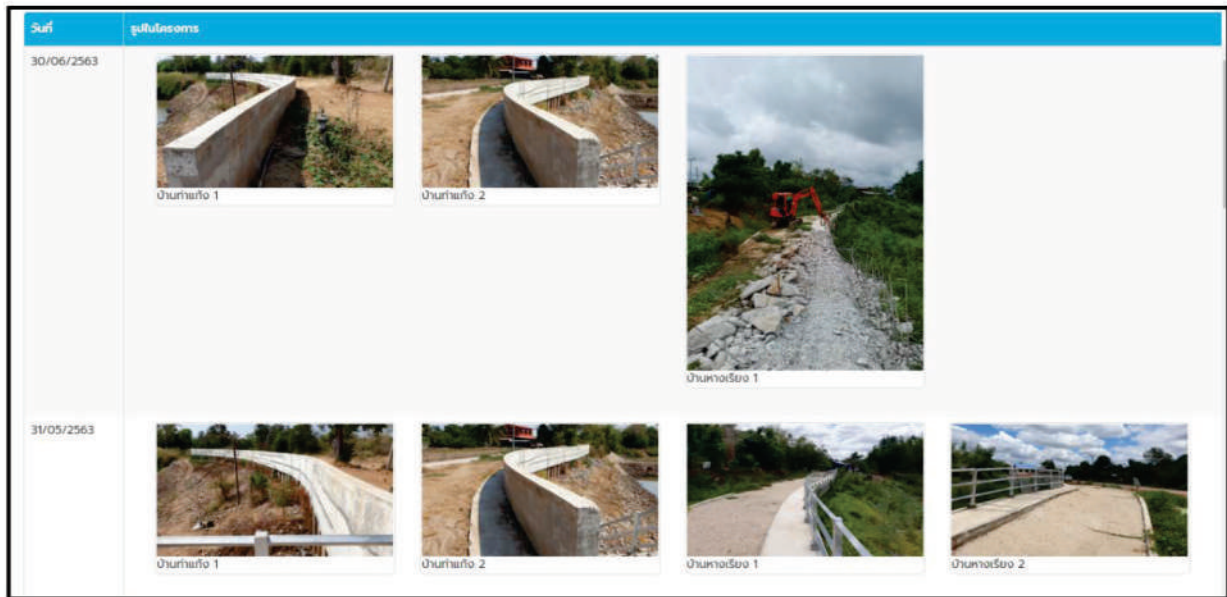

4. เมนู “รายงานความก้าวหน้าสีฟ้า” มีทั้งหมด 4 รายการย่อย แบ่งเป็น

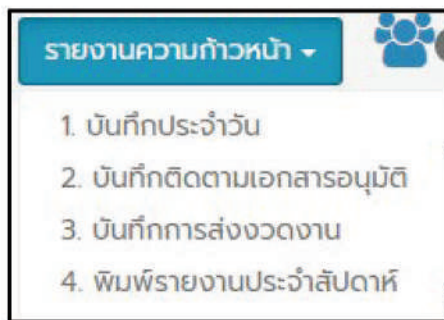

4.1 “บันทึกประจำวัน” หลังจากคลิกบันทึกประจำวันจะแสดงภาพด้านล่าง แสดงผลการปฏิบัติงานประจำวัน คลิกที่กรอบสีแดงเพื่อโหลดรายงานประจำวัน



4.2 “บันทึกติดตามเอกสารอนุมัติวัสดุ” หลังจากคลิกบันทึกติดตามเอกสารอนุมัติวัสดุ จะแสดงภาพด้านล่าง แสดงรายการหนังสืออนุมัติวัสดุต่าง ๆ

| | | | | |
|----|---|------------------------|---|---|
| 15 | หนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จ วท อปท. | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : บด.อน.196-2561-3 - ขอพิ ษณพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง.pdf | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : |
| 16 | เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : บด.อน.196-2561-104 - ขญ เปิดให้ใช้เหล็กผลิตวัสดุชนิดเหล็กเส้น เสริมคอนกรีต.pdf | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : |
| 17 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/PVC | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : บด.อน.196-2561-203 - ข ญเปิดให้ใช้ท่อระบายน้ำ กสจ. pdf | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : |
| 18 | Concrete Mixed Designed | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : มท 0717.4-658 - ขญเปิดให้ใช้ส่วนผสม คอนกรีต.pdf |
| 19 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ ชื่อไฟล์ : มท 0717.4-4177 - ขญเปิดให้ใช้เสาเข็ม.p df |

4.3 “บันทึกการส่งงวดงาน” หลังจากคลิกบันทึกการส่งงวดงานจะแสดงภาพด้านล่าง แสดงการส่งงวดงาน งบประมาณในแต่ละปี การเบิกจ่าย เงินล่วงหน้า คลิกรูปที่กรอบสีแดงเพื่อโหลด ระเบียบวาระ/เอกสาร และ เล่มประกอบการตรวจรับงาน

บันทึกการส่งงวดงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะริมแม่น้ำพระยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
มูลค่างาน : 118,650,000 บาท
เงินเบิกล่วงหน้า : 15.00% จำนวน 17,797,500 บาท
% หักจากการเบิกล่วงหน้า : 20.00%
จำนวนงวดงาน : 97 งวด/319

กดพิมพ์ ระเบียบวาระ/เอกสาร การประชุม

กดพิมพ์ เล่มประกอบการตรวจรับงาน

| งวดส่งมอบ | จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 2562 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 |
| 2563 | 34,800,000.00 | 8,837,500.00 | 25,962,500.00 |
| 2564 | 33,617,500.00 | 0.00 | 33,617,500.00 |
| 2565 | 26,232,500.00 | 0.00 | 26,232,500.00 |
| รวม | 118,650,000.00 | 32,837,500.00 | 85,812,500.00 |

Showing 1 to 4 of 4 rows

เพิ่ม

| ครั้งที่ | วันที่ส่งมอบงาน | งวดงานที่ส่ง | จำนวนเงิน | หักเงิน 20% | เบิกจ่ายแล้ว | ระเบียบวาระ/เอกสาร | เอกสารส่งงาน | หมายเหตุ | จัดการ |
|----------|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|----------|--------|
| 1 | 03/04/2563 | เงินเบิกล่วงหน้า 11, 21, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 22, 224, 225, 230, 231, 232, 26, 27, 28 | 17,797,500.00 | 0.00 | 17,797,500.00 | | | | |
| | | รวม | 36,597,500.00 | 3,760,000.00 | 32,837,500.00 | | | | |









4.4 “พิมพ์รายงานประจำสัปดาห์” หลังจากคลิกที่พิมพ์รายงานประจำสัปดาห์จะแสดงภาพด้านล่าง
แสดงผลการทำงานประจำสัปดาห์ คลิกที่กรอบสีแดงเพื่อโหลดรายงานประจำสัปดาห์

รายงานความคืบหน้าโครงการ (Progress Report)

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศรีราชา ๑.ชลบุรี
ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

กดพิมพ์ รายงานประจำสัปดาห์ (File PDF)

ชื่อประเภท: เลือก | ตั้งแต่วันที่: | ถึงวันที่: | ค้นหา

| ID | เนื้องาน | ตั้งแต่วันที่ | แผนงาน | ผลงาน | หมายเหตุ | เอกสาร |
|------|-----------|-----------------------|----------|---------|----------|---|
| 2563 | ทรูกูวเลน | วันที่ 8 - 15 | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | ทรูกูวเลน | วันที่ 1 - 7 | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | มิถุนายน | วันที่ 24 - สิ้นเดือน | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | มิถุนายน | วันที่ 16 - 23 | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | มิถุนายน | วันที่ 8 - 15 | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | มิถุนายน | วันที่ 1 - 7 | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | พฤษภาคม | วันที่ 24 - สิ้นเดือน | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |
| 2563 | พฤษภาคม | วันที่ 16 - 23 | 100.00 % | 94.10 % | ✓ |  |

บทที่ 4

ขั้นตอนสำหรับแอดมิน/ธุรการ

หลังจากใส่ รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบ (ตามที่ระบุไว้ บทที่ 1) จะปรากฏเมนู ดังนี้




เมนูของแอดมิน/ธุรการ จะแบ่งออกเป็น 17 เมนูย่อย คือ

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) จัดการโครงการ | (11) ค้างรายงาน |
| (2) รายงานประจำวัน | (12) ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ |
| (3) ภาพรวมการส่งงวดงาน | (13) จำนวนงานแยกตามจังหวัด |
| (4) สัญญาจ้างโครงการ | (14) จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน |
| (5) แบบก่อสร้าง | (15) Report |
| (6) ภาพรวมความก้าวหน้า | (16) สิทธิ์การเข้าถึง |
| (7) งานที่ล่าช้ากว่าแผน | (17) ข้อมูลหลัก |
| (8) งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค | |
| (9) งานที่แล้วเสร็จ | |
| (10) การส่งรายงานประจำสัปดาห์ | |

รายละเอียดการเข้าแต่ละเมนูย่อย เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูล ของแต่ละเมนูย่อย คือ

เมนูย่อย (1) จัดการโครงการ



การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.1 การสืบค้นข้อมูลโครงการ และ 1.2 การสร้างโครงการใหม่

| รายการงานโครงการ | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 ลำดับ | <input type="text"/> | 2 ลักษณะงาน | -- ทั้งหมด -- |
| 4 ตั้งแต่วันที่ | <input type="text"/> | 5 ถึงวันที่ | <input type="text"/> |
| 7 จังหวัด | -- กรุณาเลือก -- | 8 อำเภอ/เขต | -- กรุณาเลือก -- |
| 10 ผู้ควบคุมงาน | -- ทั้งหมด -- | 11 ลคก. ตรวจสอบงาน | -- ทั้งหมด -- |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 13 ผู้รับจ้าง | -- ทั้งหมด -- |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 14 เจ้าของงบประมาณ | -- ทั้งหมด -- |
| | | 3 งบประมาณ | -- ทั้งหมด -- |
| | | 6 สถานะ | กำลังดำเนินการ |
| | | 9 ตำบล/แขวง | -- กรุณาเลือก -- |
| | | 12 การกำกับงาน | กองควบคุมการก่อสร้าง |

1.1 การสืบค้นข้อมูลโครงการ จะปรากฏภาพข้างบน และให้ดำเนินการกรอกข้อมูลรวม 14 รายการ ดังนี้

- (1) คำค้น > ใช้เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี
- (2) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) งบประมาณ > เลือกงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) ตั้งแต่วันที่ > เลือกวันที่
- (5) ถึงวันที่ > เลือกวันที่
- (6) สถานะ > เลือกสถานะ (กำลังดำเนินการ เป็นค่าเริ่มต้น)
- (7) จังหวัด > เลือกจังหวัด
- (8) อำเภอ/เขต > เลือกอำเภอ/เขต
- (9) ตำบล/แขวง > เลือกตำบล/แขวง
- (10) ผู้ควบคุมงาน > เลือกผู้ควบคุมงาน
- (11) คณะกรรมการตรวจการจ้าง > เลือกคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- (12) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (13) ผู้รับจ้าง > เลือกผู้รับจ้าง (ค่าเริ่มต้นเป็นทั้งหมด)
- (14) เจ้าของงบประมาณ > เลือกเจ้าของงบประมาณ (ค่าเริ่มต้นเป็นทั้งหมด)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

1.2 ขั้นตอนการสร้างโครงการใหม่ หมายถึง โครงการที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลใดๆ ในระบบเลย เริ่มจาก

1) กดสร้างใหม่

รายการจบโครงการ

ค่าคืน

ตั้งแต่วันที่

จังหวัด -- กรุณาเลือก --

ผู้ควบคุมงาน -- ทั้งหมด --

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 304 รายการ

2) ลงรายละเอียดโครงการ โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูล รวม 15 รายการ ดังนี้

1 ข้อมูลโครงการ

| | |
|--|--|
| <p>รหัสโครงการ <input type="text"/></p> <p>1 สังกัดงานช่างเลขที่* <input type="text"/></p> <p>2 ลงวันที่ dd/MM/yyyy</p> <p>3 ชื่อโครงการ* <input type="text"/></p> <p>เจ้าหน้าที่ประจำงาน -- กรุณาเลือก --</p> <p>ลักษณะงาน -- กรุณาเลือก --</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง <input type="text"/></p> <p>4 มูลค่างาน <input type="text"/> บาท</p> <p>5 ค่าปรับวินัย <input type="text"/> บาท</p> <p>เงินเบิกล่วงหน้า 0.00 % <input type="text"/> บาท</p> <p>% หักจากการเบิกล่วงหน้า <input type="text"/> %</p> <p>เงินเบิกล่วงหน้าคงเหลือ 0 บาท</p> <p>6 ผู้รับจ้าง -- กรุณาเลือก --</p> <p>7 ผู้รับจ้าง -- กรุณาเลือก --</p> | <p>8 ชิงบริเวณ -- กรุณาเลือก --</p> <p>9 วันที่เริ่มต้น dd/MM/yyyy</p> <p>10 กำหนดแล้วเสร็จ dd/MM/yyyy</p> <p>รวม <input type="text"/> วัน</p> <p>จำนวนงวดงาน 0 <input type="text"/> งวด</p> <p>11 ราคาค่าจ้าง -- กรุณาเลือก --</p> <p>จังหวัด -- กรุณาเลือก --</p> <p>อำเภอ/เขต -- กรุณาเลือก --</p> <p>ตำบล/แขวง -- กรุณาเลือก --</p> <p>เส้นทาง ลมใต้ <input type="text"/></p> <p>เส้นทาง ลมเหนือ <input type="text"/></p> <p>หมายเหตุ <input type="text"/></p> |
|--|--|

2 เงินงบประมาณ

● เพิ่ม 12

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่ | หมายเหตุ | วันที่ |
|--------------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | |

3 งบประมาณวงจรถวาย

● เพิ่มกรรมการ 13

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่ | หมายเหตุ | วันที่ |
|----------|--------------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | | |

4 Project Engineer / งานโครงการ

14 ชื่อ - นามสกุล*

หมายเหตุ

5 ผู้ควบคุมงาน

● เพิ่มผู้ควบคุม 15

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่ | หมายเหตุ | วันที่ |
|----------|--------------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | | |

โดยนำข้อมูลมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและสัญญาจ้าง



คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ ๓๒๐ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานใหม่

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕ (ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี ๕๙ ห้ายน้ำ)
ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด ทำงานก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕ (ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี ๕๙ ห้ายน้ำ) ตำบลบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๗๗ เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวงเงิน ๒๑,๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน ดังต่อไปนี้

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดวันเริ่มทำงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕
(ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี ๕๙ ห้ายน้ำ) ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๗๗ เมตร

เรียน ผู้จัดการบริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้าไทย-ลาว จำกัด
ทำการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕ (ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี ๕๙ ห้ายน้ำ)
ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๗๗ เมตร ในวงเงิน ๒๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน-
ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน นั้น

บัดนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอแจ้งกำหนดวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว
โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕
(ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี ๕๙ ห้ายน้ำ) ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๗๗ เมตร
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และขอให้รีบดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า ๑๕ % ของสัญญานี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| การกำกับงาน 11 จังหวัด | -- กรุณาเลือก -- |
| | -- กรุณาเลือก -- |
| | กองควบคุมการก่อสร้าง |
| | โยธาจังหวัด บริษัทที่ปรึกษา |

เรื่อง ขอให้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดราคากลาง พร้อมแผ่น CD จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดน งบลงทุน รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม ปี ๕๙ ท้ายน้ำ) ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๗๗ เมตร งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๕๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ดังนี้

| | | |
|-----------------------|----------|----------------|
| งบประมาณปี ๒๕๖๒ | เป็นเงิน | ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๓ | เป็นเงิน | ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ | เป็นเงิน | ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท |

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบเรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

* งบประมาณโครงการ - งบประมาณปีที่ 1 - งบประมาณปีที่ 2 = งบประมาณปีที่ 3

13 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายบัญญัติ ศรีมะฆะ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสผ. | ประธานกรรมการ |
| ๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๓. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง | หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุพัตรา ช้ออ | นายช่างโยธาชำนาญงาน กมร. | กรรมการ |
| ๕. นายวีรวัฒน์ รุ่งรัตน์ | พนักงานวิศวกรโยธา สสผ. 14 | กรรมการ |

15 ผู้ควบคุมงาน

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๑. นายปิยวุฒิ ธิรโชติชัยกุล | วิศวกรโยธาชำนาญการ กคส. | ผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายอนุชา ธ.น.กลม | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สยผจ.นครพนม | ผู้ควบคุมงาน |

โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3) เมื่อลงข้อมูลครบแล้ว “บันทึก”

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="button" value="บันทึก"/> | <input type="button" value="ยกเลิก"/> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

- 4) การนำเข้างวดงาน สร้างไฟล์ excel ที่ใช้นำเข้างวดงาน โดยแบ่งเป็น 2 แถว (งวด, เงิน)
 ดังแสดง คอลัมน์ A มาจากการเรียงลำดับงวดที่ 1 ถึง งวดสุดท้าย (ดูจากสัญญาจ้าง เอกสารแนบ
 หมายเลข 2 รายละเอียดงวดงาน

| | A | B | C |
|----|-----|------------|---|
| 1 | งวด | เงิน | |
| 2 | 1 | 200,000.00 | |
| 3 | 2 | 450,000.00 | |
| 4 | 3 | 450,000.00 | |
| 5 | 4 | 450,000.00 | |
| 6 | 5 | 450,000.00 | |
| 7 | 6 | 450,000.00 | |
| 8 | 7 | 450,000.00 | |
| 9 | 8 | 450,000.00 | |
| 10 | 9 | 240,000.00 | |
| 11 | 10 | 130,000.00 | |
| 12 | 11 | 390,000.00 | |
| 13 | 12 | 390,000.00 | |
| 14 | 13 | 390,000.00 | |
| 15 | 14 | 390,000.00 | |
| 16 | 15 | 390,000.00 | |
| 17 | 16 | 390,000.00 | |
| 18 | 17 | 390,000.00 | |
| 19 | 18 | 390,000.00 | |
| 20 | 19 | 390,000.00 | |
| 21 | 20 | 390,000.00 | |

โดยข้อมูลที่กรอกในคอลัมน์ B คือ เงินหรือจำนวนเงินของแต่ละงวดงาน
ได้มาจากสัญญาจ้าง เอกสารแนบหมายเลข 2 รายละเอียดงวดงาน

เอกสารหมายเลข... ๒

รายละเอียดงวดงาน

ชื่อโครงการ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง
บ้านเนินคิง หมู่ที่ ๕ (ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี ๕๙ ท้ายน้ำ) ตำบลบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๒๒๗ เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕๐ วัน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน
๒๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้แล้วเสร็จ
- ทำการปลูกสร้างอาคารหรือจัดหาสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำแผนการก่อสร้าง
และสำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง ทำการวางผังแนวก่อสร้างพร้อมหมุดหลักฐานโยงยึด
เพื่อตรวจสอบ ตามข้อกำหนดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หลังจากทำการบันทึกงวดงานที่เป็นไฟล์ excel เข้าหน้าจัดการ โครงการ กด “นำเข้างวดงาน เลือก
ไฟล์ excel ที่ทำการบันทึกไว้”


จัดการข้อมูลงานโครงการ

จัดการงานโครงการ

1. ข้อมูลงานโครงการ

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| รหัสโครงการ | 101/2561 | งบเริ่มต้น | 2561 |
| สัญญาจ้างเลขที่* | 175/2561 | วันที่เริ่มต้น | 11/04/2561 |
| ลงวันที่ | 02/04/2561 | กำหนดอันแล้วเสร็จ | 10/03/2563 |
| ชื่อโครงการ* | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปันบางท่า ว.สุราษฎร์ธานี | รวม | 699 วัน |
| เจ้าของงบประมาณ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวนงวดงาน | 87 จำนวนเงิน 59,400,000.00 บาท |
| ลักษณะงาน | โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนประเทศ | | + นำเข้างวดงาน และรายการงวดงาน |

เมนูย่อย (2) รายงานประจำวัน



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “รายงานประจำวัน” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 6 รายการ ดังนี้

รายงานประจำวัน

รายการโครงการทั้งหมด

| | |
|---|---|
| <p>1 ชื่อ/เลขที่/รหัสโครงการ <input type="text" value="เชียงใหม่"/></p> <p>3 ประเภทโครงการ <input type="text" value="-- ทั้งหมด --"/></p> <p>5 ค้นหาด้วยรายชื่อ <input type="text" value="-- ทั้งหมด --"/> <input type="button" value="ค้นหา"/></p> | <p>2 งบประมาณ <input type="text" value="-- ทั้งหมด --"/></p> <p>4 สถานะ <input type="text" value="ยังไม่สิ้นสุดสัญญา"/></p> <p>6 ประเภทโครงการ <input type="text" value="-- ทั้งหมด --"/></p> |
|---|---|

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 26 รายการ

1 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม่ฝอยของแผ่นดิน อ.เมือง จ.เชียงราย

5นแม่ฝอยก เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
 เลขที่สัญญา 224/2559 งบประมาณ 2559
 ชื่อผู้รับจ้าง บริษัทเชียงราย เอสแอลพี จำกัด
 งบประมาณ 65,700,000 บาท
 ระยะเวลา 18/04/2559 - 07/04/2561
 แผนงาน 100 % ผลงาน 86.84 % งานที่ระดมเงินที่ 16 - 23 สิงหาคม 2563
 งวดงาน 137 ส่วนแล้ว 14

ประเภทโครงการ: **ระบบโทรคมนาคมประจำวัน**

รายละเอียดโครงการ: **ระบบโทรคมนาคมประจำวัน**

หมายเลขจดหมาย: +66 511 23 33 33


ดูภาพการก่อสร้าง

- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าชัย
- (2) งบประมาณ > เลือกงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) บทบาทในโครงการ > เลือกบทบาทในโครงการ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) สถานะ > เลือกสถานะ (ยังไม่สิ้นสุดสัญญา เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ค้นหาด้วยรายชื่อ > ชื่อคณะกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน
- (6) ประเภทโครงการ > เลือกประเภทโครงการ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ

เมนูย่อย (3) ภาพการส่งงวดงาน



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “ภาพการส่งงวดงาน” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 3 รายการ ดังนี้

ภาพรวมการส่งงวดงาน

ภาพกราฟการส่งงวดงาน

1 ปีงบประมาณ -- ทั้งหมด -- 2 ลักษณะงาน -- ทั้งหมด -- 3 คำค้น

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 570 รายการ

| ลำดับ | เลขที่สัญญา | ชื่อโครงการ | จำนวนงวดงาน | ส่งแล้ว | ค้างส่ง | จำนวนเงิน | Preview |
|-------|-------------|--|-------------|---------|---------|---------------|---------|
| 1 | 233/2562 | เรียนเมืองกันตังอิมคลองบางนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนา อำเภอบางนา จังหวัดน่าน | 100 | 81 | 19 | 1,186,310,000 | |
| 2 | 79/2562 | เรียนเมืองกันตังอิมแม่น้ำโขง บ้านเลขที่ (ต.เมืองกันตัง 60 บ้านน้ำ) ต.กันตัง อ.เมืองจันทบุรี | 156 | 63 | 93 | 1,918,230,000 | |
| 3 | 281/2558 | โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำรวมในตำบลบึงพระฝาง หมู่ที่ 2 อ.บึงพระฝาง จ.นครสวรรค์ (สัญญาฉบับ 281-1/2558) | 204 | 112 | 92 | 3,759,314,437 | |
| 4 | 146/2560 | โครงการพัฒนาระบบชลประทานฝายเมืองจันทบุรี อ.บางบาล จ.สุพรรณบุรี ระยะที่ 3 จ.สุพรรณบุรี (สัญญาฉบับ 146-1/2560) | 79 | 48 | 31 | 557,160,000 | |
| 5 | 274/2562 | เรียนเมืองกันตังอิมแม่น้ำโขง บ้านอิมคลอง หมู่ที่ 20 ตำบลอิม อำเภออิม จังหวัดสุรินทร์ | 128 | 108 | 20 | 7,530,840,000 | |

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียด ภาพการส่งงวดงาน

เมนูย่อย (4) สัญญาจ้างโครงการ



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “สัญญาจ้างโครงการ” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 3 รายการ ดังนี้

สัญญาจ้างโครงการ

รายการสืบค้นสัญญาจ้างโครงการ

1 ปีงบประมาณ:

2 คำค้น:

3 สถานะ:

แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

เขียนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรง ณ บ้านป่าหมาก ตำบลนาตาหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ภาคกลาง เมืองตรัง ตรัง
 งบประมาณ 39,580,000 บาท
 รหัสเวลา 12/07/2562 - 21/04/2564
 แผนงาน 68.3 % ผลงาน 100 % สอทำรายงาน วันที่ 24 - สิ้นเดือน มิถุนายน 2563
 ๐๖๐๖๖๖ 57 สอ.ลว 57



แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) คำค้น > ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี
- (3) สถานะ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด สัญญาจ้างโครงการ

เมนูย่อย (5) แบบก่อสร้าง



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “แบบก่อสร้าง” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้

แบบก่อสร้างโครงการ

รายการแบบก่อสร้างโครงการ

1. ชื่อประเภท

2. คำค้น

3. สถานะ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ณ บ้านป่าหมาก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ขนาดล่อง เมืองตรัง ตรัง
งบประมาณ 39,580,000 บาท
รหัสวง 12/07/2562 - 21/04/2564
ผลงาน 68.3 % ผลงาน 100 % สิ้นทำรายงาน วันที่ 24 - สิ้นเดือน มิถุนายน 2563
อวตงาน 57 ล่องแล้ว 57



1. ปังบประมาณ > เลือกปังบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
2. คำค้น > ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี
3. สถานะ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)


เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด แบบก่อสร้างโครงการ

เมนูย่อย (6) ภาพรวมความก้าวหน้า



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “ภาพรวมความก้าวหน้า” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 3 รายการ ดังนี้

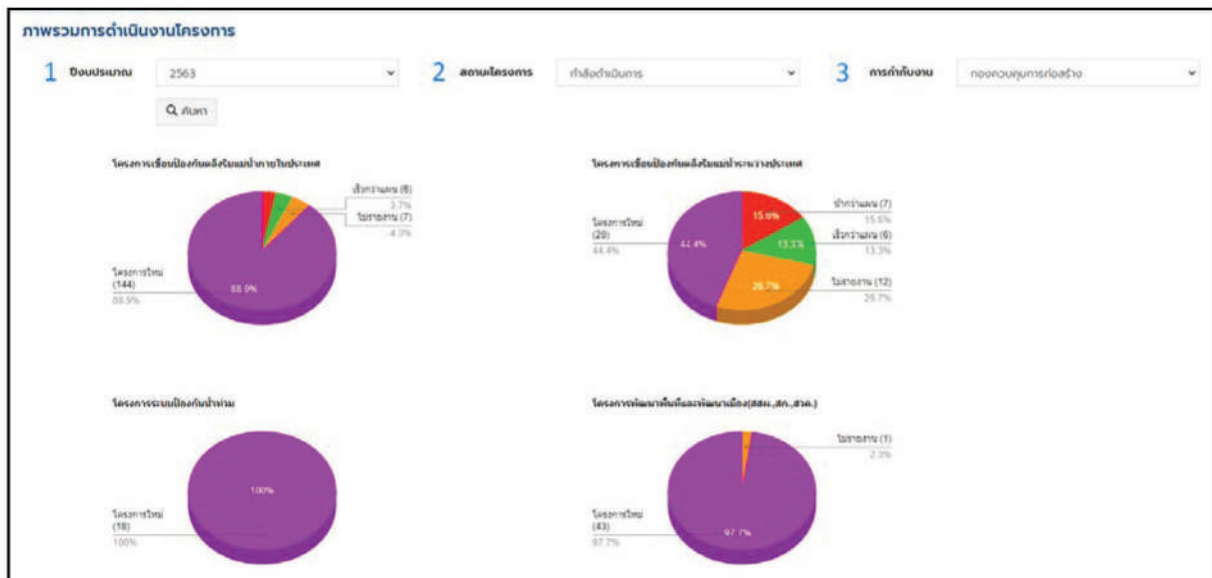

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ปีปัจจุบัน เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) สถานะโครงการ > เลือกสถานะ (กำลังดำเนินการ เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กำลังดำเนินการ เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด ภาพความก้าวหน้า

เมนูย่อย (7) งานที่ช้ากว่าแผน



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “งานที่ช้ากว่าแผน” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 5 รายการ ดังนี้

งานที่ช้ากว่าแผน

รายการโครงการที่ช้ากว่าแผน

1 คำค้น 2 ปีงบประมาณ -- เลือกปี -- 3 ลักษณะงาน -- เลือกงาน --

4 การกำกับงาน 5 ผู้ควบคุมงาน -- เลือกคน --

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 267 รายการ

1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบ้านท่าแก้ง ม. 9 ตำบลหางแย้ ม. 8 อ.ชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง บริษัท เวิลด์วิจ คอนกรีต จำกัด

งบประมาณ 20,450,000 บาท สัญญาเลขที่ 79/2558

ระยะเวลา 14/11/2557 - 12/07/2563

ผลรวม 100 % ผลงาน 95.72 % ส่วนที่รวมงาน วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2563

งวดงาน 35 ส่งแล้ว 29

ค่าจ่าย 4.28 %

- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี
- (2) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ผู้ควบคุมงาน > เลือกรายชื่อ

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด งานที่ช้ากว่าแผน

เมนูย่อย (8) งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 5 รายการ ดังนี้

งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค


รายการโครงการในที่สุดงาน

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--|
| 1 คำค้น | <input type="text"/> | 2 ปีงบประมาณ | <input type="text" value="-- เลือกปี --"/> |
| 4 การกำกับงาน | <input type="text" value="กองควบคุมการก่อสร้าง"/> | 3 ลักษณะงาน | <input type="text" value="-- เลือก --"/> |
| | | 5 ผู้ควบคุมงาน | <input type="text" value="-- เลือก --"/> |

แสดงรายการ 1 ถึง 20 จาก 80 รายการ

1. บริษัทอำนวยการสำนักงานอัยการสูงสุด ระบบไฟฟ้าอาคารระดับแยก

พระนคร กรุงเทพมหานคร
 ผู้รับจ้าง การไฟฟ้าบางพลี
 งบประมาณ 48,827,853 บาท สัญญาเลขที่ 904/2554
 ระยะเวลา 05/01/2555 - 29/03/2556
 หมายเหตุ 99.99 % ผลงาน 100 % ส่วนการขอเงิน วันที่ 24 - สิงหาคม สิงหาคม 2563
 งวดงาน 0 สิ้นแล้ว 0
 หยุดงาน(เวลาพัก)



- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำ โขง แม่น้ำชี
- (2) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ผู้ควบคุมงาน > เลือกผู้ควบคุมงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด งานที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา/ประสบปัญหาอุปสรรค

เมนูย่อย (9) งานที่แล้วเสร็จ



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “งานที่แล้วเสร็จ” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 5 รายการ ดังนี้

งานที่แล้วเสร็จ

รายการโครงการที่แล้วเสร็จ

1 คำค้น 2 ชื่อประเภท -- ทั้งหมด -- 3 สืบค้นงาน -- ทั้งหมด --

4 การกำกับงาน 5 ผู้ควบคุมงาน

แสดงรายการที่ 1 ถึง 18 จาก 18 รายการ

1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านปากห้วยม่วง หมู่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 57 เหนือน้ำ) อ.เมือง จ.นครพนม


เขื่อนนครพนม นครพนม
ผู้รับจ้าง ศาตวรรษวิวัฒน์ สาขาจตุร คอนกรีตคอนกรีต
งบประมาณ 81,490,000 บาท สัญญาเลขที่ 226/2559
ร-ยเวลา 18/04/2559 - 07/05/2562
แผนงาน 99.99 % ผลงาน 100 % จบทำรายงาน วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
งวดงาน 210 ลังแล้ว 0 วันรับรายงาน 16/02/2562
แล้วเสร็จ(คณะกรรมการตรวจรับแล้ว) วันที่

- (1) คำค้น > เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี
- (2) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) ผู้ควบคุมงาน > เลือกผู้ควบคุมงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด งานที่แล้วเสร็จ

เมนูย่อย (10) การส่งรายงานประจำสัปดาห์



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “การส่งรายงานประจำสัปดาห์” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 4 รายการ ดังนี้

| รายงานการส่งงาน | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 1 | ปีรายงาน | -- ทั้งหมด -- | ▼ |
| 2 | เดือน | สิงหาคม | ▼ |
| 3 | ประเภทผู้ควบคุมงาน | -- ทั้งหมด -- | ▼ |
| 4 | ผู้ควบคุมงาน | | Q ค้นหา |


- (1) ปีที่รายงาน > เลือกปีที่รายงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) เดือน > เลือกเดือน (เดือนปัจจุบัน เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) ผู้ควบคุมงาน > ใส่ชื่อผู้ควบคุมงาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

Q ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียด การส่งรายงานประจำสัปดาห์

เมนูย่อย (11) ค้างรายงาน



การสืบค้นข้อมูลรายงาน “ค้างรายงาน” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 2 รายการ ดังนี้



(1) ปีที่ยังงาน > เลือกปีที่รายงาน

(2) เดือน > เลือกเดือน

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด ค้างรายงาน

เมนูย่อย (12) ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ” แบ่งออกเป็น 2 วิธี

วิธีที่ 1 จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 10 รายการ ดังนี้


| GIS Monitor - งานโครงการใช้ที่ดิน | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|---|------------------|--------------------|----|--------------------|---------------------|
| 1 | ชื่อประเภท | -- ทั้งหมด -- | 2 | สถานะ | ยังไม่สิ้นสุดสัญญา | 3 | ประเภทผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน (กตท.) |
| 4 | ลักษณะงาน | -- ทั้งหมด -- | | | | | | |
| 5 | โครงการ | -- กรุณาเลือก -- | 6 | เส้นรุ้ง ละติจูด | | 7 | เส้นแวง ลองจิจูด | |
| 8 | จังหวัด | -- กรุณาเลือก -- | 9 | อำเภอ/เขต | -- กรุณาเลือก -- | 10 | ตำบล/แขวง | -- กรุณาเลือก -- |
| <input type="button" value="ค้นหา"/> | | | | | | | | |

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) สถานะ > เลือกสถานะ (ยังไม่สิ้นสุดสัญญา เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน กตท. เป็นค่าเริ่มต้น)
- (4) ลักษณะงาน > เลือกลักษณะงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (5) โครงการ > เลือกโครงการ
- (6) เส้นรุ้ง ละติจูด > ใส่ค่า ละติจูด
- (7) เส้นแวง ลองจิจูด > ใส่ค่า ลองจิจูด
- (8) จังหวัด > เลือกจังหวัด
- (9) อำเภอ/เขต > เลือกอำเภอ/เขต
- (10) ตำบล/แขวง > เลือกตำบล/แขวง

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

วิธีที่ 2 จะปรากฏภาพ ตึกเครื่องหมาย หน้ารายชื่อผู้ควบคุมงาน จะแสดง โครงการด้านขบวนการแผนที่

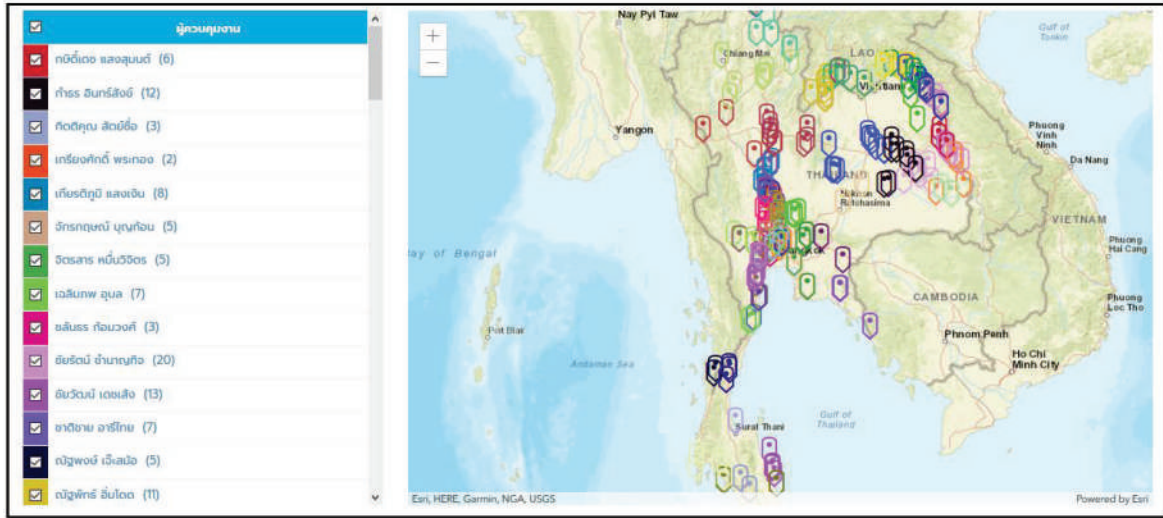

เมนูย่อย (13) จำนวนงานแยกตามจังหวัด



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “จำนวนงานแยกตามจังหวัด” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้

จำนวนงานแยกตามจังหวัด

1 ปีงบประมาณ -- ทั้งหมด -- 2 สถานโครงการ กทม/นครปฐม 3 การกำกับงาน กองควบคุมการก่อสร้าง

ค้นหา

จำนวนงานแยกตามจังหวัดทั้งหมด 520 โครงการ

| ลำดับ | จังหวัด | โครงการเป็นวงเงิน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท | โครงการเป็นวงเงิน ตั้งแต่ 1 แสนบาท | โครงการวงเงิน ไม่ระบุ | โครงการสนับสนุน และสนับสนุน | โครงการอื่น และไม่มีระบุ | งานดำเนินการจ้าง (รวมงานซ่อมแซม) | โครงการอื่น | รวม |
|-------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| 1 | กทม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | กำแพงเพชร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) สถานะโครงการ > เลือกสถานะ (กำลังดำเนินการ เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) การกำกับงาน > เลือกการกำกับงาน (กองควบคุมการก่อสร้าง เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียด จำนวนงานแยกตามจังหวัด

เมนูย่อย (14) จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน” จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้

| จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|-----|
| 1 ปีงบประมาณ | -- ทั้งหมด -- | 2 สถานะโครงการ | -- ทั้งหมด -- | 3 ประเภทผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน (กคส.) | Q ค้นหา | | | |
| จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงานทั้งหมด รวม 95 คน | | | | | | | | | |
| ลำดับ | ผู้ควบคุมงาน | โครงการเดือน มิถุนายน 2561 (ตามใบแจ้งหนี้) | โครงการเดือน กรกฎาคม 2561 (ตามใบแจ้งหนี้) | โครงการมอบใบแจ้งหนี้ไปรวม | โครงการส่งงานคืน 25-31 ธันวาคม 2561 | โครงการเดือนธันวาคม 2561 (ยังไม่ส่งใบแจ้งหนี้) | งานใหม่ที่ได้รับงานจ้าง (ควบคุมงานและควบคุมงานอื่น) | โครงการอื่นๆ | รวม |
| 1 | กิติศักดิ์ ชลสูงเนินดี | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ทอชณวัฒน์ ธีระฤกษ์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ภัทร ชินศรีสิงห์ | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | กิตติคุณ สติยธีร | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | เกียรติศักดิ์ พรมภอ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

- (1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (2) สถานะโครงการ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- (3) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ผู้ควบคุมงาน กคส. เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียด จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน

เมนูย่อย (15) Report



การเปิดดูรายงาน “Report” จะปรากฏภาพ แบ่งรายงานเป็นทั้งหมด 12 รายงาน ดังนี้

| รายงาน | |
|--|--------------------------|
| รพทพ | |
| RP001-รายงานภาพรวมความก้าวหน้า | <input type="checkbox"/> |
| RP002-รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามภาค) | <input type="checkbox"/> |
| RP003-รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (จังหวัด) | <input type="checkbox"/> |
| RP004-รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (อำเภอ) | <input type="checkbox"/> |
| RP005-รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ | <input type="checkbox"/> |
| RP006-รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ) | <input type="checkbox"/> |
| RP007-รายงานข้อมูลชื่อผู้รับจ้าง-จำนวนสถานการณ์ที่ดำเนินการ (Black List) | <input type="checkbox"/> |

- (1) RP001-รายงานความก้าวหน้า
- (2) RP002-รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามภาค)
- (3) RP003-รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (จังหวัด)
- (4) RP004-รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (อำเภอ)
- (5) RP005-รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ
- (6) RP006-รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ)
- (7) RP007-รายงานข้อมูลชื่อผู้รับจ้าง-จำนวนสถานการณ์ที่ดำเนินการ (Black List)
- (8) RP008-รายงานจำนวนแยกตามจังหวัด
- (9) RP009-รายงานจำนวนแยกตามผู้ควบคุมงาน
- (10) RP0010-รายงานสรุปโครงการตามผู้ควบคุมงาน
- (11) RP0011-รายงานสรุปโครงการตามคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- (12) RP0012-รายงานสรุปโครงการตาม Project Engineer/เลขาโครงการ

เมนูย่อย (16) จัดการสิทธิ์การเข้าถึง



จัดการให้สิทธิ์การใช้งานแต่ละเมนู จะปรากฏภาพข้างล่าง และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 2 รายการ ดังนี้

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

จัดการสิทธิ์การใช้งาน

1 ประเภทผู้ใช้งาน

2 สิทธิ์การใช้งาน

- จัดการโครงการ
- จัดการโครงการ (ใบเสร็จวีซี)
- รายงานประจำวัน
- การรวมการส่งงวดงาน
- สิทธิ์คว้างโครงการ
- แบบก่อสร้าง
- การรวมความก้าวหน้า
- งานใช้ค่าประเมิน
- งานคือผู้ระหว่างกับสัญญา/ประเมินสัญญาประมูล
- งานแล้วเสร็จ
- การส่งรายงานประจำสัปดาห์
- ส่งรายงาน
- ค่าเผื่อใต้งานโครงการ
- จำนวนงานแยกตามวีซี
- จำนวนงานแยกตามผู้ควบคุมงาน
- Report
- จัดการสิทธิ์การเข้าถึง
- ข้อมูลหลัก

บันทึก

(1) ประเภทผู้ใช้งาน > เลือกประเภทผู้ใช้งาน (ผู้ดูแลระบบ เป็นค่าเริ่มต้น)

(2) สิทธิ์การใช้งาน > หัวข้อที่ต้องการให้สิทธิ์

เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้ว

เมนูย่อย (17) ข้อมูลหลัก



การใช้งาน “ข้อมูลหลัก” เป็นการจัดการข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 24 การจัดการ ดังนี้

จัดการข้อมูลหลัก

เมนู - ข้อมูลหลัก

| | |
|--|---|
| จัดการเจ้าหน้าที่ | ☰ |
| จัดการประเภท | ☰ |
| จัดการบริษัทผู้รับจ้าง | ☰ |
| จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ☰ |
| จัดการข้อมูลบุคลากร (Man Power) | ☰ |
| จัดการข้อมูลเครื่องมือจักร (Equipment) | ☰ |

(1) จัดการเจ้าหน้าที่

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. สืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ 2. เพิ่มเจ้าหน้าที่ 3. การแก้ไขข้อมูล

(1.1) สืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 6 รายการ ดังนี้

จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่


สืบค้นข้อมูลเจ้าหน้าที่


| | | | | | |
|---|----------------|---|---|---------------|---------------|
| 1 | คำค้น | <input type="text"/> | 2 | ประเภทบุคลากร | -- ทั้งหมด -- |
| 3 | กลุ่มงาน | -- ทั้งหมด -- | 4 | ตำแหน่ง | -- ทั้งหมด -- |
| 5 | บทบาทผู้ใช้งาน | -- ทั้งหมด -- | | | |
| 6 | สถานะ | <input type="radio"/> ทั้งหมด <input type="radio"/> มีงานแล้ว <input checked="" type="radio"/> ไม่มีงาน | | | |

- 1) คำค้น > ชื่อ นามสกุล คำ 1 คำ ที่ต้องการสืบค้น เช่น ทอง รัตน์
- 2) ประเภทบุคลากร > เลือกประเภทบุคลากร (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 3) กลุ่มงาน > เลือกกลุ่มงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 4) ตำแหน่ง > เลือกตำแหน่ง (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 5) บทบาทผู้ใช้งาน > เลือกบทบาท (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 6) สถานะ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)

เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้ว

(1.2) เพิ่มเจ้าหน้าที่ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 11 รายการ ดังนี้

 เพิ่มเจ้าหน้าที่

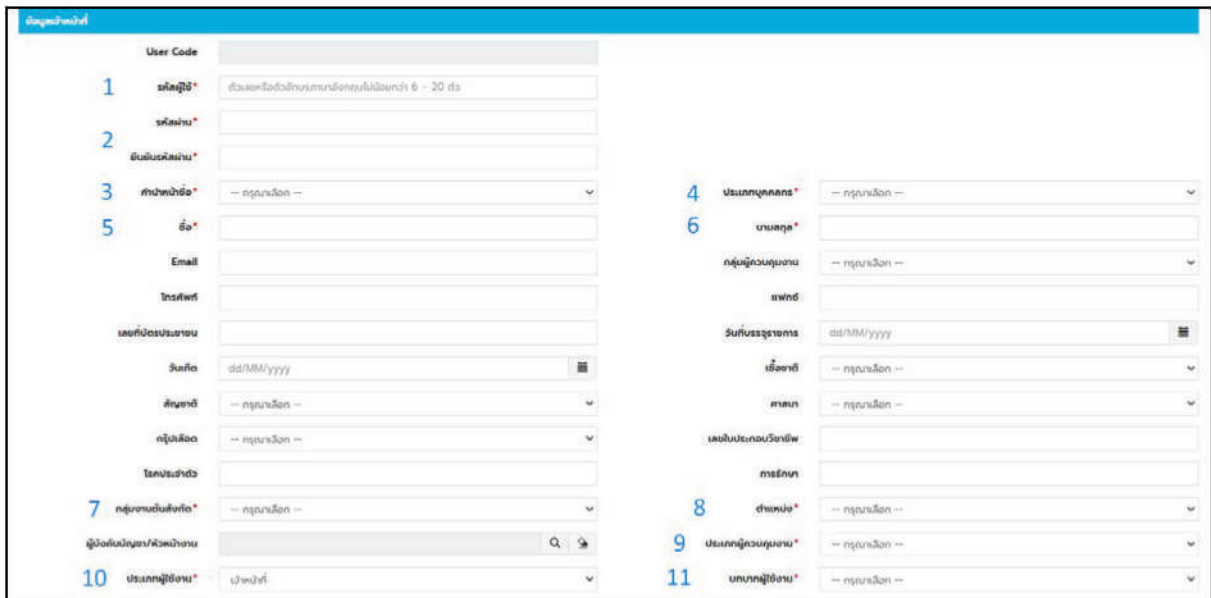

The screenshot shows a web form for adding a staff member. The form is titled 'เพิ่มเจ้าหน้าที่' and contains 11 numbered fields:

- รหัสผู้ใช้* (User Code): A text field with a note 'ต้องเลือกตัวอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดไม่เกิน 6 - 20 ตัว'.
- รหัสผ่าน* (Password): A text field.
- ยืนยันรหัสผ่าน* (Confirm Password): A text field.
- ตำแหน่ง* (Position): A dropdown menu.
- ชื่อ* (Name): A text field.
- Email: A text field.
- โทรศัพท์ (Phone): A text field.
- เลขที่บัตรประชาชน (ID Number): A text field.
- วันเกิด (Date of Birth): A date picker.
- สัญชาติ (Nationality): A dropdown menu.
- กลุ่มเลือด (Blood Type): A dropdown menu.
- ใบประกอบวิชาชีพ (Professional License): A text field.
- ประเภทบุคลากร* (Employee Type): A dropdown menu.
- นามสกุล* (Surname): A text field.
- กลุ่มควบคุมงาน (Work Group): A dropdown menu.
- แผนก (Department): A dropdown menu.
- เลขใบประกอบวิชาชีพ (Professional License): A text field.
- กรรณิก (Title): A dropdown menu.
- ตำแหน่ง* (Position): A dropdown menu.
- ประเภทผู้ควบคุมงาน* (Supervisor Type): A dropdown menu.
- บทบาทผู้ใช้งาน* (User Role): A dropdown menu.

เครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

- 1) รหัสผู้ใช้ > ตั้งรหัสผู้ใช้ เช่น dpt100 sup100 sao100 vip001
- 2) รหัสผ่าน > ตั้งรหัสผ่าน
- 3) ตำแหน่ง > เลือกตำแหน่ง
- 4) ประเภทบุคลากร > เลือกประเภทบุคลากร
- 5) ชื่อ > เติมชื่อ
- 6) นามสกุล > เติมนามสกุล
- 7) กลุ่มงานต้นสังกัด > เลือกกลุ่มงานต้นสังกัด
- 8) ตำแหน่ง > เลือกตำแหน่ง
- 9) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน
- 10) ประเภทผู้ใช้งาน > เลือกประเภทผู้ใช้งาน
- 11) บทบาทผู้ใช้งาน > เลือกบทบาทผู้ใช้งาน

เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้ว  บันทึก

(1.3) การแก้ไขข้อมูล


 แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว  บันทึก

(2) จัดการบทบาท

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มบทบาท
2. การแก้ไขข้อมูล

(2.1) เพิ่มบทบาท จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้

 เพิ่มข้อมูล

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------|---|
| 1 | ลำดับ * | <input type="text" value="0"/> |
| 2 | ชื่อ * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input type="radio"/> ใช้งานได้ <input checked="" type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |
| | | <input type="button" value="บันทึก"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/> |

- 1) ลำดับ > เพิ่มลำดับ
- 2) ชื่อ > เพิ่มชื่อ
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

(2.2) การแก้ไขข้อมูล

 แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

(3) จัดการบริษัทผู้รับจ้าง

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลบริษัทผู้รับจ้าง

2. การแก้ไขข้อมูล

(3.1) เพิ่มข้อมูลบริษัทผู้รับจ้าง จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้

 เพิ่มข้อมูล

จัดการข้อมูลบริษัทผู้รับจ้าง

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)

2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

 บันทึก

(3.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

 บันทึก


(4) จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

การใช้งานแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. เพิ่มเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการ
2. เพิ่มเอกสารอนุมัติวัสดุ
3. การแก้ไขข้อมูล

(4.1) เพิ่มเอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล

รวม 5 รายการ ดังนี้



จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

| | | |
|---------------------|---|---|
| รหัส | 1 | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| ชื่อ (ภาษาไทย) * | 2 | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | 3 | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| ประเภทโครงการ * | 4 | <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="กรุณาเลือก"/> |
| หมายเหตุ | | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 95%;"></div> |
| สถานะ * | 5 | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) รหัส > เพิ่มรหัส
- 2) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 3) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 4) สถานะ > เลือกสถานะ


เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(4.2) เพิ่มเอกสารอนุมัติวัสดุ จะปรากฏภาพ

เลือกประเภทเอกสารอนุมัติวัสดุที่ต้องการเพิ่ม 

| รหัส | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ | ประเภทเอกสาร | สถานะ | จัดการ |
|------|---|---|--|-----------|---|
| D001 | เอกสารอนุมัติ (ยื่นใบจองที่ดิน) | เอกสารอนุมัติ (ยื่นใบจองที่ดิน) | โครงการยื่นใบจองที่ดินแม่ข่ายในประเทศ | ใช้งานได้ |    |
| D002 | เอกสารอนุมัติ (ระบบจองกินไร่ร่วม) | เอกสารอนุมัติ (ระบบจองกินไร่ร่วม) | โครงการระบบจองกินไร่ร่วม | ใช้งานได้ |    |
| D003 | เอกสารอนุมัติ (งานพัฒนาพื้นที่) | เอกสารอนุมัติ (งานพัฒนาพื้นที่) | โครงการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาระบบ(สมท.สท.สท) | ใช้งานได้ |    |
| D004 | เอกสารอนุมัติ (ยื่นใบจองที่ดิน) | เอกสารอนุมัติ (ยื่นใบจองที่ดิน) | โครงการยื่นใบจองที่ดินแม่ข่ายต่างประเทศ | ใช้งานได้ |    |
| D005 | เอกสารอนุมัติ (งานอาคาร) | เอกสารอนุมัติ (งานอาคาร) | งานบริการควบคุมงาน (หน่วยงานอื่น) | ใช้งานได้ |    |
| D006 | เอกสารอนุมัติ (งานซ่อมแซมและปรับปรุง) | เอกสารอนุมัติ (งานซ่อมแซมและปรับปรุง) | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง(กบร.) | ใช้งานได้ |    |
| D007 | เอกสารอนุมัติ (โครงการอื่น ๆ งานอาคาร, งานระบบ) | เอกสารอนุมัติ (โครงการอื่น ๆ งานอาคาร, งานระบบ) | โครงการอื่น | ใช้งานได้ |    |

 **เพิ่ม**

ภาพข้างล่างเพิ่ม 3 รายการคือ

| ลำดับ | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ | สถานะ | จัดการ |
|-------|-------------|----------------|-------------------------------------|---|
| 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 1 | 2 | 3 | | |

- 1) ลำดับ > เพิ่มลำดับ
- 2) ชื่อภาษาไทย > เพิ่มชื่อภาษาไทย
- 3) ชื่อภาษาอังกฤษ > เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว 

(4.3) การแก้ไขข้อมูล


 แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว 

(5) จัดการบุคลากร (Man Power)

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลบุคลากร
2. การแก้ไขข้อมูล

(5.1) เพิ่มข้อมูลบุคลากร จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้

 เพิ่ม

จัดการข้อมูลบุคลากร (Man Power)

ข้อมูล

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | รหัส | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="width: 95%; height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

 บันทึก

(5.2) การแก้ไขข้อมูล

 แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


 บันทึก

(6) จัดการข้อมูลเครื่องจักร (Equipment)

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลเครื่องจักร
2. การแก้ไขข้อมูล

(6.1) เพิ่มข้อมูลเครื่องจักร จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลเครื่องจักร (Equipment)

| ข้อมูล | |
|-----------------------|---|
| รหัส | <input type="text"/> |
| 1 ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(6.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก


(7) จัดการประเภทของปัญหา

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลประเภทของปัญหา
2. การแก้ไขข้อมูล

(7.1) เพิ่มข้อมูลประเภทของปัญหา จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล

รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลประเภทของปัญหา

ข้อมูล

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| | รหัส | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="width: 95%; height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(7.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก

(8) จัดการข้อมูลวันในระหว่างสัปดาห์

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลวันในระหว่างสัปดาห์
2. การแก้ไขข้อมูล

(8.1) เพิ่มข้อมูลวันในระหว่างสัปดาห์ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 5 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลวันในระหว่างสัปดาห์

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | ตั้งแต่วันที่ * | <input type="text" value="0"/> |
| 4 | ถึงวันที่ * | <input type="text" value="0"/> |
| 5 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) ตั้งแต่วันที่ > ใส่วันที่
- 4) ถึงวันที่ > ใส่วันที่
- 5) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(8.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(9) จัดการข้อมูลปี

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลปี
2. การแก้ไขข้อมูล

(9.1) เพิ่มข้อมูลปี จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 2 รายการ ดังนี้

 เพิ่ม

ข้อมูล

| | | |
|---|--------|--|
| 1 | ชื่อ * | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| 2 | ค่า * | <input style="width: 80%;" type="text" value="0"/> |

 บันทึก
 ยกเลิก

- 1) ชื่อ > เพิ่มชื่อ
- 2) ค่า > เพิ่มค่า

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

 บันทึก

(9.2) การแก้ไขข้อมูล

 แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว  บันทึก

(10) จัดการหน่วยงานภายนอก

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลหน่วยงานภายนอก
2. การแก้ไขข้อมูล

(10.1) เพิ่มข้อมูลหน่วยงานภายนอก จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูล

| | | |
|---|--------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย)* | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)* | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล* | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(10.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(11) จัดการกลุ่มของแผนก

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลกลุ่มของแผนก
2. การแก้ไขข้อมูล

(11.1) เพิ่มข้อมูลกลุ่มของแผนก จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล
รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลกลุ่มแผนก

ข้อมูล

| | | |
|----------|---------------------------|---|
| | รหัส | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย)* | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)* | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="width: 95%; height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล* | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(11.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก

(12) จัดการแผนก

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลแผนก
2. การแก้ไขข้อมูล

(12.1) เพิ่มข้อมูลแผนก จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 5 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลแผนก

| ข้อมูล | |
|--------|--|
| | รหัส <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย)* <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)* <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ <input type="text"/> |
| 3 | กลุ่มของแผนก* <input type="text" value="-- กรุณาเลือก --"/> |
| 4 | ประเภทของแผนก* <input type="text" value="-- กรุณาเลือก --"/> |
| 5 | สถานะข้อมูล* <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) กลุ่มของแผนก > เลือกกลุ่มของแผนก
- 4) ประเภทของแผนก > เลือกประเภทของแผนก
- 5) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(12.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(13) จัดการตำแหน่ง

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลตำแหน่ง
2. การแก้ไขข้อมูล

(13.1) เพิ่มข้อมูลตำแหน่ง จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลตำแหน่ง

ข้อมูล

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| | รหัส | |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | |
| | จังหวัด | เลือก ▼ |
| | หมายเหตุ | |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(13.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(14) จัดการค่านำหน้าชื่อ

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลค่านำหน้าชื่อ
2. การแก้ไขข้อมูล

(14.1) เพิ่มข้อมูลค่านำหน้าชื่อ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูลรวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลค่านำหน้าชื่อ

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(14.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(15) จัดการสัญญาชาติ

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลสัญญาชาติ
2. การแก้ไขข้อมูล

(15.1) เพิ่มข้อมูลสัญญาชาติ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลคำนำหน้าชื่อ

ข้อมูล

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| | รหัส | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="width: 80%; height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(15.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(16) จัดการกลุ่มเลือด

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลกลุ่มเลือด
2. การแก้ไขข้อมูล

(16.1) เพิ่มข้อมูลกลุ่มเลือด จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ



จัดการข้อมูลหมู่เลือด

| ข้อมูล | |
|-----------------------|---|
| รหัส | <input type="text"/> |
| 1 ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(16.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(17) จัดการเชื้อชาติ

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลเชื้อชาติ
2. การแก้ไขข้อมูล

(17.1) เพิ่มข้อมูลเชื้อชาติ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลเชื้อชาติ

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(17.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก

(18) จัดการศาสนา

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลศาสนา
2. การแก้ไขข้อมูล

(18.1) เพิ่มข้อมูลศาสนา จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลศาสนา

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

(18.2) การแก้ไขข้อมูล



(19) จัดการระดับการศึกษา

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลการศึกษา
2. การแก้ไขข้อมูล

(19.1) เพิ่มข้อมูลการศึกษา จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลระดับการศึกษา

ข้อมูล

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(19.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก

(20) จัดการสถานศึกษา

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
2. การแก้ไขข้อมูล

(20.1) เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(20.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(21) จัดการประเทศ

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลประเทศ
2. การแก้ไขข้อมูล

(21.1) เพิ่มข้อมูลประเทศ จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลประเทศ

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="width: 95%; height: 40px;" type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(21.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก

(22) จัดการจังหวัด

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลจังหวัด
2. การแก้ไขข้อมูล

(22.1) เพิ่มข้อมูลจังหวัด จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 3 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลจังหวัด

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | กลุ่มจังหวัด | <input type="text" value="เลือก"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(22.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว


บันทึก

(23) จัดการอำเภอ/เขต

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลอำเภอ/เขต
2. การแก้ไขข้อมูล

(23.1) เพิ่มข้อมูลอำเภอ/เขต จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 5 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลอำเภอ

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input style="width: 80%; height: 30px;" type="text"/> |
| 3 | เป็นกิ่งอำเภอ * | <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่ <input type="radio"/> ใช่ |
| 4 | จังหวัด * | <input style="width: 80%;" type="text" value="-- กรุณาเลือก --"/> |
| 5 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) เป็นกิ่งอำเภอ > เลือกเป็นกิ่งอำเภอ
- 4) จังหวัด > เลือกจังหวัด
- 5) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

บันทึก

(23.2) การแก้ไขข้อมูล



แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บันทึก

(24) จัดการตำบล/แขวง

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. เพิ่มข้อมูลตำบล/แขวง
2. การแก้ไขข้อมูล

(24.1) เพิ่มข้อมูลตำบล/แขวง จะปรากฏภาพ และให้ดำเนินการเลือกข้อมูล รวม 4 รายการ ดังนี้



จัดการข้อมูลตำบล

ข้อมูล

| | | |
|---|---------------------|---|
| | รหัส | <input type="text"/> |
| 1 | ชื่อ (ภาษาไทย) * | <input type="text"/> |
| 2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * | <input type="text"/> |
| | หมายเหตุ | <input type="text"/> |
| 3 | อำเภอ * | <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="Q"/> |
| 4 | สถานะข้อมูล * | <input checked="" type="radio"/> ใช้งานได้ <input type="radio"/> ไม่ให้ใช้งาน |

- 1) ชื่อ (ภาษาไทย) > เพิ่มชื่อ (ภาษาไทย)
- 2) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) > เพิ่มชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
- 3) อำเภอ > เลือกอำเภอ
- 4) สถานะข้อมูล > เลือกสถานะข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่ต้องการแล้ว

(24.2) การแก้ไขข้อมูล




แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว

บทที่ 5

ขั้นตอนสำหรับผู้ควบคุมงาน

หลังจากใส่ รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบ (ตามที่ระบุไว้ บทที่ 1) จะปรากฏเมนู ดังนี้

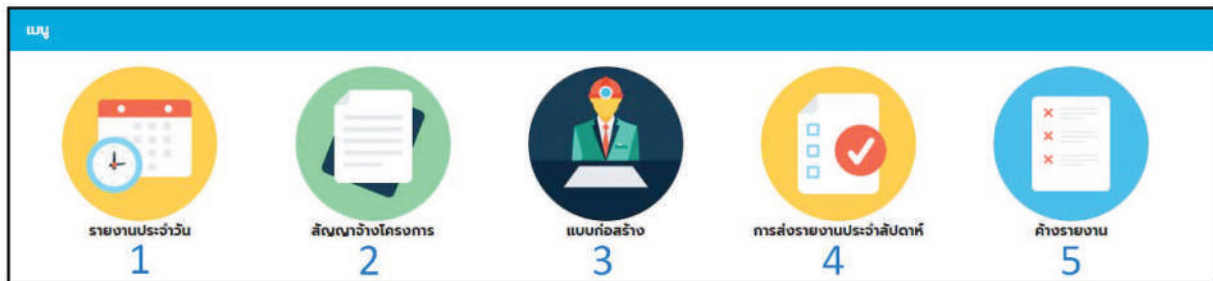


เมนูของผู้ควบคุมงานจะแบ่งออกเป็น 5 เมนูย่อย ประกอบด้วย

- 1) รายงานประจำวัน
- 2) สัญญาจ้าง โครงการ
- 3) แบบก่อสร้าง
- 4) การส่งรายงานประจำสัปดาห์
- 5) ค้างรายงาน

หากกดเข้าทั้ง 5 เมนูย่อย จะสามารถสืบค้น โครงการ กรอกข้อมูลความคืบหน้าของการทำงาน การเบิกจ่าย การส่งงวดงาน การอนุมัติวัสดุ ค้างรายละเอียดของแต่ละเมนูย่อย คือ

เมนูย่อย 1 รายงานประจำวัน



เข้าสู่หน้า “รายงานประจำวัน” หน้านี้จะสามารถดำเนินการลงข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล


(1) การลงข้อมูล

สิ่งที่คุณควบคุมงานต้องลงข้อมูลเพิ่มเติมจากเค้าโครงที่ ADMIN สร้างไว้ มีอยู่ทั้งหมด 7 หัวข้อ โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. นำเข้าแผนงานก่อสร้าง
 2. นำเข้าแผนงานรายเดือน
 3. สร้างรายการอนุมัติเอกสาร
 4. กำหนดตำแหน่งภาพถ่าย
 5. บันทึกประจำวัน
 6. บันทึกการเบิกจ่ายเงิน 15 เปอร์เซ็นต์
 7. บันทึกการส่งงวดงาน
- ข้อควรระวัง

ขั้นตอนการลงข้อมูลของคุณควบคุมงาน

- 1) เมนู “รายงานประจำวัน”



- 2) เลือกโครงการที่จะนำข้อมูลเข้า กดหัวข้อ “ข้อมูลตั้งต้น” ต้องนำเข้าข้อมูลทั้งหมด 4 หัวข้อ โดยแบ่งเป็นดังนี้
 - นำเข้าแผนงานก่อสร้าง (ข้อมูลได้จากบริษัทที่เซ็นต์สัญญาฯ)
 - นำเข้าแผนงานรายเดือน (ข้อมูลได้จากบริษัทที่เซ็นต์สัญญาฯ)
 - สร้างรายการเอกสารอนุมัติวัสดุ
 - กำหนดตำแหน่งภาพถ่าย

10. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคั้ง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ก้ายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
 เลขที่สัญญา 50/2562 งบประมาณ 2562
 ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด
 งบประมาณ 21,540,000 บาท
 ระยะเวลา 27/03/2562 - 04/01/2564
 แผนงาน 56.51 % ผลงาน 96.68 % รอบทำรายงาน วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
 งวดงาน 44 ส่งแล้ว 0 สถานะ : กำลังดำเนินการ

ระยะเวลาคงเหลือ 327 วัน
เร็วว่าแผน 40.17 %

บทบาทในโครงการ : ผู้ควบคุมงาน
 รับผิดชอบรายงานประจำวัน

ข้อมูลตั้งต้น - รายงานความก้าวหน้า - ตรวจสอบตัดสิทธิ์ - พิมพ์เอกสารตรวจสอบสิทธิ์

เป้าหมายงานก่อสร้าง 1
 เป้าเข้าแผนงานรายเดือน 2 **ขง บ้านท่าหมามแก้ว หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ก้ายน้ำ) ต.หนอง**
 สร้างรายการเอกสารอนุมัติ 3
 กำหนดตำแหน่งถ่ายภาพ 4 562

บทบาทในโครงการ : ผู้ควบคุมงาน
 รับผิดชอบรายงานประจำวัน

12. วัตถุประสงค์งานโครงการ

+ บ้านเขื่อนงาน - ดูข้อมูลแผนงาน - อนุมัติโครงการ

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน | ปีงบประมาณ | หน่วย | ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ | สถานะ |
|--|-----------------|---------|------------|-------|---------------|------------|-------|
| 1 เปิดช่วยซ่อมฝ้า ผนังก่อสร้าง สร้างสำนักงาน ล้างคูน้ำ | 200,000.00 | 0.93 | 100 | เมตร | 01/04/2562 | 31/07/2562 | + |
| 2 ป่าหินใหญ่ยกของรวม 3 น สถานที่ก่อสร้าง | 3,150,000.00 | 14.62 | 100 | เมตร | 01/05/2562 | 31/12/2562 | + |
| 3 ป่าแม่โป่งสร้างถนนคอนกรีต 3 น สถานที่ก่อสร้าง | 240,000.00 | 1.11 | 100 | เมตร | 01/05/2562 | 30/06/2562 | + |
| 4 ป่าหนองหลวงสร้างถนนคอนกรีต 3 น สถานที่ก่อสร้าง | 130,000.00 | 0.60 | 100 | เมตร | 01/05/2562 | 30/06/2562 | + |
| 5 ป่าทรายบนหนองรวม 3 น สถานที่ก่อสร้าง | 3,900,000.00 | 18.11 | 100 | เมตร | 01/06/2562 | 30/04/2563 | + |
| 6 กิ่งหินใหญ่ขึ้นเขื่อน กิ่งหินใหญ่เปิดเขื่อน | 2,200,000.00 | 10.21 | 100 | เมตร | 01/11/2562 | 31/01/2563 | + |
| 7 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเขื่อนพร้อมบรรจุหินใหญ่ | 560,000.00 | 2.60 | 100 | เมตร | 01/12/2562 | 28/02/2563 | + |
| 8 งบทราบเงินแบบบ้านเขื่อน | 5,100,000.00 | 23.68 | 100 | เมตร | 01/01/2563 | 30/06/2563 | + |

11. แผนงานรายเดือน

เพิ่ม 2

| ลำดับ | ปี | เดือน | % แผน | หมายเหตุ |
|-------|------|----------|-------|----------|
| 1 | 2562 | เมษายน | 0.23 | |
| 2 | 2562 | พฤษภาคม | 4.73 | |
| 3 | 2562 | มิถุนายน | 4.73 | |
| 4 | 2562 | กรกฎาคม | 3.87 | |
| 5 | 2562 | สิงหาคม | 3.64 | |
| 6 | 2562 | กันยายน | 1.83 | |

ติดตามเอกสารอนุมัติ 3

เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคั้ง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ก้ายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม

| ลำดับ | เอกสารประกอบการพิจารณา | หนังสือผู้รับจ้าง | หนังสือผู้ควบคุมงาน | หนังสืออนุมัติ (ประธาน) |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | หนังสือรายงานการเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง(ภายใน 15 วัน) | +ไฟล์แนบ... ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ... ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ... ชื่อไฟล์ : |
| 2 | หนังสือแจ้งประธานฯเพื่อพิจารณาเงินกรณการฯ ประชุม Kick Off | +ไฟล์แนบ... ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ... ชื่อไฟล์ : | +ไฟล์แนบ... ชื่อไฟล์ : |

| ลำดับที่ | รายการ | หมายเหตุ |
|----------|--------|-----------|
| 1 | +0.00 | หัวเดือน |
| 2 | +136 | กลางเดือน |
| 3 | +277 | ท้ายเดือน |

- 3) หลังจากนำเข้าสู่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ไปที่หน้า “รายงานประจำวัน”
เลือกโครงการที่บันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว หัวข้อ “รายงานความก้าวหน้า”
เลือกหัวข้อย่อย “บันทึกประจำวัน”

10. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคณิง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
เลขที่สัญญา 50/2562 บังบประมาณ 2562
ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด
งบประมาณ 21,540,000 บาท
ระยะเวลา 27/03/2562 - 04/01/2564
แผนงาน 56.51 % ผลงาน 96.68 % รอบทำรายงาน วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
งวดงาน 44 ส่งแล้ว 0 สถานะ : กำลังดำเนินการ

ข้อมูลเบื้องต้น | รายงานความก้าวหน้า | ตรวจสอบตัดสิทธิ์ | พิมพ์เอกสารตรวจสอบสิทธิ์

11. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคณิง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
เลขที่สัญญา 61/2562 บังบประมาณ 2562
ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด
งบประมาณ 39,700,000 บาท
ระยะเวลา 27/03/2562 - 04/01/2564

บันทึกประจำวัน
บันทึกติดตามเอกสารอนุมัติ
บันทึกการส่งงวดงาน
พิมพ์รายงานประจำสัปดาห์
S-Curve
บันทึกสถานะโครงการ

12. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคณิง หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.หนองแก อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
หนองแก ท่าอุเทน นครพนม
เลขที่สัญญา 61/2562 บังบประมาณ 2562
ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด
งบประมาณ 39,700,000 บาท
ระยะเวลา 27/03/2562 - 04/01/2564

- เมื่อเข้ามาในหน้าบันทึกประจำวัน “เลือกวันเวลาที่รายงาน” แล้ว “บันทึกรายงานประจำวัน”

รายงานความคืบหน้าโครงการ (Progress Report)

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคณิง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 59 ท้ายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
บ้านแพง บ้านแพง นครพนม

วันเวลาที่รายงาน: 08/02/2563

ค้นหาข้อมูลรายงานประจำวัน

งบประมาณ: เลือก ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:

- ลงข้อมูลผลการทำงานในแต่ละวัน

รายงานความคืบหน้าโครงการ (Progress Report)

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเป็ดแดง หมู่ที่ 5 (ตลิ่งเดิมเชื่อมเดิม 59 ไร่) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
บ้านแพง บ้านแพง นครพนม

แผนงาน (%) ผลงาน (%)
 วิศวกรรม 40.21% ระยะเวลาใช้งาน

สภาพความคืบหน้า

| เวลา | เสร็จ | ไม่เสร็จ | รอรับ |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| เวลาเช้า (7:30 - 12:00) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> |
| เวลาบ่าย (13:30 - 17:00) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> |
| เวลาค่ำ (17:30 - 7:00) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> |

บุคลากรและเครื่องมือ

บุคลากร (Man Power) + เพิ่ม

| รายการ | จำนวน | จัดการ |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| วิทยุแบบ(FM) | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ช่างสำรวจ(Survey) | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| คนขับรถ/เครื่องจักร | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| กรรมกร | 7 | <input checked="" type="checkbox"/> |

เครื่องมือ (Equipment) + เพิ่ม

| รายการ | จำนวน | จัดการ |
|------------------|-------|-------------------------------------|
| เรือลากจูง | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| เรือลำเลียงวัสดุ | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> |

บัญชี-บัญชี รายการ:
 รายละเอียดการปฏิบัติงาน:

บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน

| รายการ | จำนวนเงิน | สัดส่วน | ปริมาณ | หน่วย | ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ | งบเบิกจ่าย | บาท | บาท | หน่วย | หมายเหตุ (ถ้ามี) |
|---|--------------|---------|--------|-------|---------------|------------|------------|------|------|-------|------------------|
| 1 เชื้อเพลิงรถนำ แยกก่อสร้าง สร้าง ส่วนตลิ่ง ส่วนลวดจูง | 200,000.00 | 0.93% | 100 | เมตร | 01/04/2562 | 31/07/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 2 นำหินใหญ่มาถมที่บริเวณ 5 ล. สถานี กอ 5 ล. | 3,150,000.00 | 14.62% | 100 | เมตร | 01/05/2562 | 31/12/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 3 นำหินใหญ่มาถมที่บริเวณ 5 ล. สถานี กอ 5 ล. | 240,000.00 | 1.11% | 100 | เมตร | 01/05/2562 | 30/06/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 4 นำเครื่องจักรมาถมที่บริเวณ 5 ล. สถานี กอ 5 ล. | 130,000.00 | 0.60% | 100 | เมตร | 01/05/2562 | 30/06/2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 5 นำรถขนมาถมที่บริเวณ 5 ล. สถานี กอ 5 ล. | 3,900,000.00 | 18.11% | 100 | เมตร | 01/06/2562 | 30/04/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 6 ก่อสร้างคันดินเชื่อม ก่อสร้างคันดินเชื่อม | 2,200,000.00 | 10.21% | 100 | เมตร | 01/11/2562 | 31/01/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 7 ปลูกฝังต้นไม้บริเวณคันดินเชื่อม | 560,000.00 | 2.60% | 100 | เมตร | 01/12/2562 | 28/02/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 8 ถมดินบริเวณคันดินเชื่อม | 3,100,000.00 | 14.52% | 100 | เมตร | 01/01/2563 | 30/06/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 9 ก่อสร้างคันดินเชื่อมบริเวณคันดินเชื่อม | 2,800,000.00 | 13.00% | 100 | เมตร | 01/01/2563 | 31/07/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 10 ก่อสร้างคันดินเชื่อม | 155,000.00 | 0.72% | 100 | เมตร | 01/01/2563 | 31/07/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |
| 11 งานระบายน้ำจากหลังเขื่อนออกหน้าเขื่อน | 98,085.00 | 0.46% | 100 | เมตร | 01/01/2563 | 31/07/2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เมตร | |

- หลังจากลงข้อมูลผลการทำงานแล้ว แนบไฟล์ (ถ้ามี) และกดอัปโหลดไฟล์รูปภาพ


The screenshot shows a form with the following fields and buttons:

- ไฟล์แนบ**: A green button with a plus sign and the text "+ ไฟล์แนบ...".
- ผู้แนบไฟล์**: A text input field.
- วันเวลาที่แนบไฟล์**: A text input field.
- รูปภาพการดำเนินงาน**: A pink header bar.
- + อัปโหลดไฟล์รูปภาพ**: A button with a plus sign and a camera icon, highlighted with a red box.
- ↔ ข้อมูลรูปภาพเปรียบเทียบ**: A button with a double-headed arrow.


The screenshot shows a dialog box titled "อัปโหลดไฟล์" (Upload File) with the following fields and buttons:

- ตำแหน่งรูปภาพ**: A dropdown menu with the text "เลือก" (Select).
- ไฟล์รูปภาพ**: A green button with a plus sign and the text "+ ไฟล์แนบ...".
- วันที่เวลา**: A text input field containing "12/02/2563 11:28:17".
- Save** and **Cancel**: Two buttons at the bottom.



โดยเลือกจุดตำแหน่งที่กำหนดไว้ก่อนนำเข้าสู่ข้อมูล “ตำแหน่งภาพถ่าย”




* ภาพถ่าย ถ่ายภาพมุมเดิม (ทุกสิ้นเดือน, เดือนละ 1 ภาพ/จุดตำแหน่งรูปภาพ) โดยภาพถ่ายที่นำไปแสดงภาพที่หน้า “บันทึกรายงานประจำวัน” จะเป็นภาพถ่ายที่อัพโหลดล่าสุด

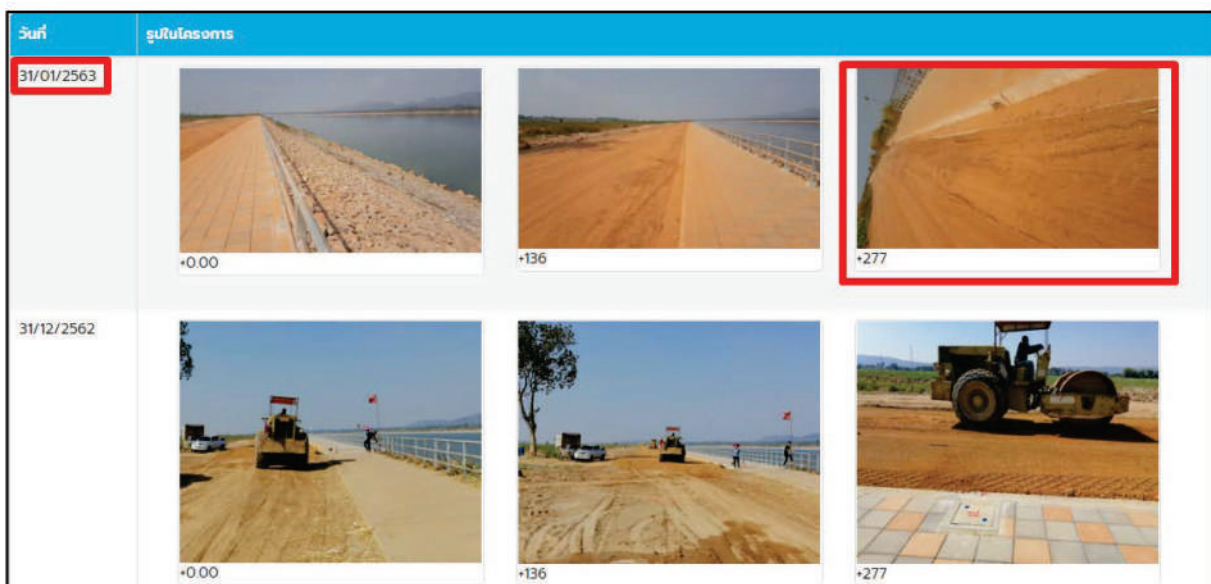


ถ้าจะให้จุดแรกแสดงภาพบนหน้าจอ “บันทึกรายงานประจำวัน” ต้องอัปโหลดภาพ
เป็นรูปสุดท้าย (ตัวอย่าง +0.00, +136, +277 ต้องอัปโหลดภาพ +277, +136, +0.00)

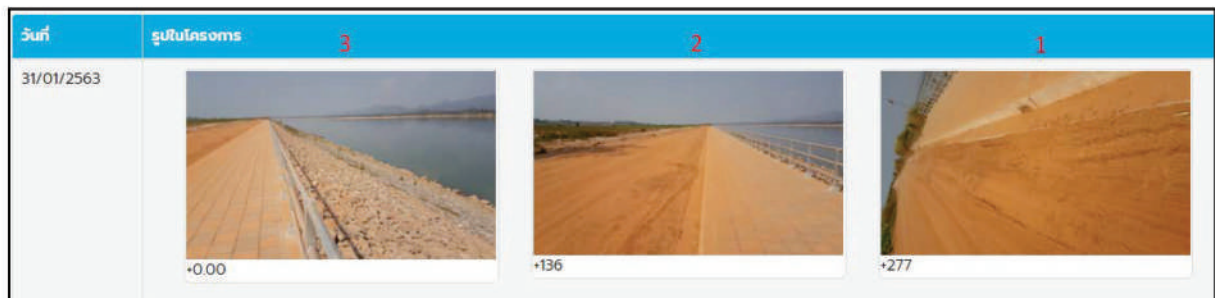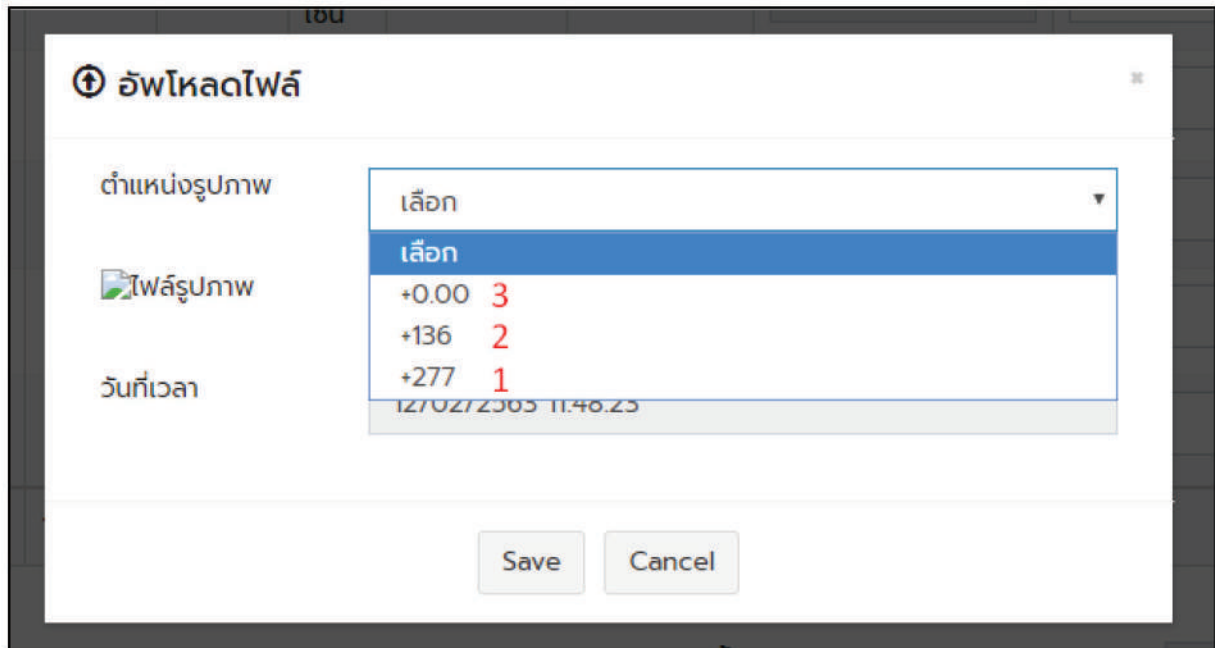

หลังจากอัปโหลดภาพเสร็จแล้ว “บันทึก”



- 4) การบันทึกการเบิกจ่ายเงิน 15 เปอร์เซ็นต์
หัวข้อรายงานความก้าวหน้า > บันทึกสถานะโครงการ

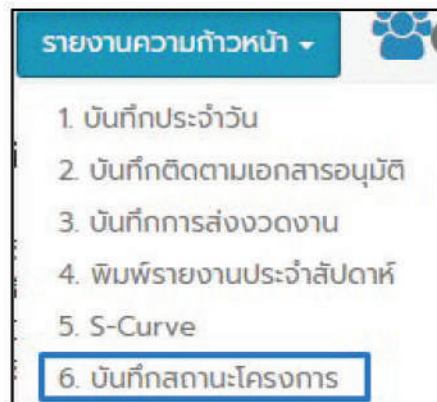

เลื่อนเมาส์ (scroll mouse) ไปบนสุด จะพบช่อง เงินเบิกล่วงหน้า

จัดการงานโครงการ

1. ข้อมูลงานโครงการ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---------|------------------|--|-----------------------|---------|--|--|--|
| รหัสโครงการ | 335/2561 | เดือนเริ่มต้น | 2562 | | | | | | | | |
| สถานะจ้างเลขที่* | 50/2562 <input type="button" value="เลือกโครงการแบบใหม่"/> | วันที่เริ่มต้น | 27/03/2562 | | | | | | | | |
| ลงวันที่ | 12/03/2562 | กำหนดสิ้นสุด | 04/01/2564 | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ* | เรื่องเปิดงานก่อสร้างแม่ข่าย บ้านเดี่ยว 5 (ตั้งเมืองเชียงใหม่ 59 ตำบล) ๑.บ้านพอ ๑.บ้านพอ ๑.นครพนม | รวม | 649 วัน | | | | | | | | |
| เจ้าของงบประมาณ | สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ | จำนวนงวดงาน | 44 | | | | | | | | |
| ลักษณะงาน | โครงการเมืองเชียงใหม่ไม่ระวางประเทศ | จำนวนเงิน | 21,540,000.00 บาท | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | การชำระเงิน | ตกลงตามการก่อสร้าง | | | | | | | | |
| มูลค่างาน | 21,540,000.00 บาท | จังหวัด | นครพนม | | | | | | | | |
| ค่าปรับวันละ | 21,540.00 บาท | อำเภอ/เขต | บ้านพอ | | | | | | | | |
| | | ตำบล/แขวง | บ้านพอ | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>เงินเบิกล่วงหน้า</td> <td>15.00 %</td> <td>3,231,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td></td> <td>% ศักยภาพเบิกล่วงหน้า</td> <td>20.00 %</td> <td></td> </tr> </table> | | A | เงินเบิกล่วงหน้า | 15.00 % | 3,231,000.00 บาท | | % ศักยภาพเบิกล่วงหน้า | 20.00 % | | | |
| A | เงินเบิกล่วงหน้า | 15.00 % | 3,231,000.00 บาท | | | | | | | | |
| | % ศักยภาพเบิกล่วงหน้า | 20.00 % | | | | | | | | | |

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่เหลือทั้งหมด

5) การบันทึกงวดงาน หัวข้อ “รายงานความก้าวหน้า” เลือกรหัสย่อย “บันทึกการส่งงวดงาน”

| | | |
|---|---|---|
| <p>10. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคดิง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเชื่อนเดิมปี 59 กายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม</p> <p>บ้านแพง บ้านแพง นครพนม เลขที่สัญญา 50/2562 บังบประมาณ 2562 ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ไทย-ลาว จำกัด งบประมาณ 21,540,000 บาท ระยะเวลา 27/03/2562 - 04/01/2564 แผนงาน 56.51 % ผลงาน 96.68 % รอบทำรายงาน วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 งวดงาน 44 ส่งแล้ว 0</p> | <p>บทบาทในโครงการ : ผู้ควบคุมงาน รับผิดชอบรายงานประจำวัน</p> <p>ระยะเวลาคงเหลือ 327 วัน เป็นไปตาม 40.17 %</p> | |
| <p>ข้อมูลเบื้องต้น - รายงานความก้าวหน้า - ตรวจสอบตัดสิทธิ์ - พิมพ์เอกสารตรวจสอบสิทธิ์</p> | <p>11. เชื้อนป้องกันเกาะ อ.ท่าอุเทน : เมแก้ว หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเชื่อนเดิมปี 59 กายน้ำ) ต.หนอง</p> <p>หนองเกาะ ท่าอุเทน เลขที่สัญญา 61/25 ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท ที งบประมาณ 39,70๕</p> | <p>บทบาทในโครงการ : ผู้ควบคุมงาน รับผิดชอบรายงานประจำวัน</p> |

เข้าสู่หน้าบันทึกการส่งงวดงาน “เพิ่ม”

บันทึกการส่งงวดงาน

เขียนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคดิง หมู่ที่ 5 (ต่อเดือนเดือนเดิมปี 59 กายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
บ้านแพง บ้านแพง นครพนม

มูลค่างาน : 21,540,000 บาท
เงินเบิกล่วงหน้า : 15.00% จำนวน 3,231,000 บาท
% ศักยภาพเบิกล่วงหน้า : 20.00%
จำนวนงวดงาน : 44 งวดแล้ว 0

| งวดปี/เดือน | จำนวนเงิน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 2562 | 6,200,000.00 | 3,231,000.00 | 2,969,000.00 |
| 2563 | 12,400,000.00 | 0.00 | 12,400,000.00 |
| 2564 | 2,940,000.00 | 0.00 | 2,940,000.00 |
| รวม | 21,540,000.00 | 3,231,000.00 | 18,309,000.00 |

Showing 1 to 3 of 3 rows

เพิ่ม

| งวดที่ | วันที่ตรวจรับงาน | งวดงานที่ส่ง | จำนวนเงิน | คิดเงิน 20% | เบิกจ่ายแล้ว | เงินเบิก/ยอดขาด | ยอดคงส่งงาน | หมายเหตุ | วันที่ |
|--------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|----------|--------|
| | | เงินเบิกล่วงหน้า | 3,231,000.00 | 0.00 | 3,231,000.00 | | | | |
| | | รวม | 3,231,000.00 | 0.00 | 3,231,000.00 | | | | |

เลือกวันที่ส่งงวดงาน และเลือกงวดที่ส่งงาน

บันทึกการส่งงวดงาน

เขียนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเนินคดิง หมู่ที่ 5 (ต่อเดือนเดือนเดิมปี 59 กายน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
บ้านแพง บ้านแพง นครพนม

มูลค่างาน : 21,540,000 บาท
เงินเบิกล่วงหน้า : 15.00% จำนวน 3,231,000 บาท
% ศักยภาพเบิกล่วงหน้า : 20.00%
จำนวนงวดงาน : 44 งวดแล้ว 0

รวมจำนวนงวดงาน วันที่ส่งงวดงาน

งวดที่ส่งงาน หมายเหตุ

จำนวนเงินที่ส่ง % ศักยภาพเบิกล่วงหน้า 20.00

เงินที่วิศวกรเบิกล่วงหน้า เบิกจ่ายแล้ว 3,231,000.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> งวดที่ 1 (200,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 2 (450,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 3 (450,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 4 (450,000.00) |
| <input type="checkbox"/> งวดที่ 5 (450,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 6 (450,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 7 (450,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 8 (450,000.00) |
| <input type="checkbox"/> งวดที่ 9 (240,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 10 (130,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 11 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 12 (390,000.00) |
| <input type="checkbox"/> งวดที่ 13 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 14 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 15 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 16 (390,000.00) |
| <input type="checkbox"/> งวดที่ 17 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 18 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 19 (390,000.00) | <input type="checkbox"/> งวดที่ 20 (390,000.00) |

รายงาน/วาระการประชุม

เอกสารประกอบการตรวจรับงาน

ข้อควรระวังที่ผู้ควบคุมงานพึงระวัง คือ ที่การแสดงผลเปอร์เซ็นต์ผลงานไม่ถูกต้องหรือเปอร์เซ็นต์ผลงานไม่แสดง

1) ห้ามแก้ไขรายละเอียดแผนงานก่อสร้างใน web application

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | คิววัน | ปริมาณ | หน่วย | เริ่มวันที่ | สิ้นสุด | จัดการ |
|--|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 1 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 200,000.00 | 0.93 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/04/2562 | 31/07/2562 | |
| 2 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 3,150,000.00 | 14.62 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/05/2562 | 31/12/2562 | |
| 3 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 240,000.00 | 1.11 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/05/2562 | 30/06/2562 | |
| 4 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 130,000.00 | 0.60 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/05/2562 | 30/06/2562 | |
| 5 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 3,900,000.00 | 18.11 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/06/2562 | 30/04/2563 | |
| 6 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 2,200,000.00 | 10.21 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/11/2562 | 31/01/2563 | |
| 7 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 560,000.00 | 2.60 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/12/2562 | 28/02/2563 | |
| 8 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 5,100,000.00 | 23.68 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/01/2563 | 30/06/2563 | |
| 9 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 2,800,000.00 | 13.00 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/01/2563 | 31/07/2563 | |
| 10 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 155,000.00 | 0.72 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/01/2563 | 31/07/2563 | |
| 11 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 98,085.00 | 0.46 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/01/2563 | 31/07/2563 | |
| 12 เบื้องต้นก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สรรพวง | 294,945.00 | 1.37 | 100 | เปอร์เซ็นต์ | 01/06/2563 | 30/09/2563 | |

ถ้าต้องการจะแก้ไข ต้องนำแผนเข้าใหม่

2) % แผนงานรวม (Excel Template) ก่อนนำเข้า web application จะต้องเท่ากับ 100.00 % เท่านั้น

3) ปริมาณงานทั้งหมดในแต่ละ Item ควรกำหนดให้เป็น 100 % เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผลงานรายวัน หรือ หากผู้ควบคุมงานกำหนดปริมาณงานทั้งหมดในแต่ละ Item ตาม BOQ การประเมินผลงานประจำวันจะต้องใส่ปริมาณ (หน่วย) ที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ จากปริมาณงานทั้งหมด (หน่วย)

4) หาก % แผนงานและผลงาน ไม่อัปเดตข้อมูลหรือมีข้อผิดพลาดในการแสดงผล ควรติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินที่ดูแลในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ

(2) การสืบค้นข้อมูล

รายงานประจำวัน

รายการงานโครงการที่สืบค้น

1 ชื่อเลขที่/จังหวัด โครงการ

2 งบประมาณ -- ทั้งหมด --

3 บทบาทในโครงการ -- ทั้งหมด --

4 สถานะ ยังไม่สิ้นสุดสัญญา

ค้นหา

แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณซอยท่าเรือ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี

บทบาทในโครงการ : ผู้ควบคุมงาน
ครบถ้วนรายงานประจำวัน

นาโพธิ์ ลพบุรี
เลขที่สัญญา 162/2562 งบประมาณ 2562
สัญญาจ้าง ค่าจ้างส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 64,320,000 บาท
เริ่มวันที่ 12/06/2562 - 11/05/2564
แผนงาน 6337 % ผลงาน 7336 % รอบที่รายงาน วันที่ 24 - สิ้นเดือน สิงหาคม 2563
งวดงาน 92 สิ้นแล้ว 45 สถานะ : กำลังดำเนินการ

ระยะเวลาของงาน 258 วัน
สัญญา 100%

ดูภาพโครงการ

ดูรายละเอียด

รายงานประจำวัน

ตรวจสอบสิทธิ์

บันทึกการตรวจสอบสิทธิ์

การสืบค้นข้อมูลโครงการ “รายงานประจำวัน” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้


- 1) คำค้น > ใช้เลขที่สัญญา ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโจง แม่น้ำชี
- 2) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ
- 3) บทบาทในโครงการ > เลือกบทบาทในโครงการ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 4) สถานะ > เลือกสถานะ (ยังไม่สิ้นสุดสัญญา เป็นค่าเริ่มต้น)

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

ค้นหา

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ รายงานประจำวัน

เมนูย่อย 2. สัญญาจ้างโครงการ



สัญญาจ้างโครงการ

รายการสัญญาจ้างโครงการ

1 ปีงบประมาณ -- เลือกปี --

2 คำค้น

3 สถานะ -- เลือกสถานะ --

Q ค้นหา

แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ณ บ้านป่าหมาก ตำบลเขาตหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งบราชการ 12/07/2562 - 21/04/2564

งบประมาณ 39,580,000 บาท

งบรวม 68.3 % ผลงาน 100 % รอยต่อราชการ วันที่ 24 - ธันวาคม 01 ตุลาคม 2563

งวดงาน 57 สัปดาห์ 57

สัญญาจ้างโครงการ | อนุมัติ | BOQ

4 5 6



การสืบค้นข้อมูลโครงการ “สัญญาจ้างโครงการ” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- 1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 2) คำค้น > ใช้ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโจง แม่น้ำชี
- 3) สถานะ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ สัญญาจ้างโครงการ

- 4) กวดคาน์โหลตสัญญาจ้างโครงการ
- 5) กวดคาน์โหลตงวดงาน
- 6) กวดคาน์โหลต BOQ

เมนูย่อย 3. แบบก่อสร้าง



แบบก่อสร้างโครงการ

รายการแบบก่อสร้างโครงการ

1 ปีงบประมาณ

2 คำค้น

3 สถานะ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

เขียนป้องกันดั่งริมน้ำตรง ณ บ้านป่าหมาก ตำบลนาตาหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นาตาหลวง เมืองตรัง ตรัง
 งบประมาณ 39,580,000 บาท
 ระยะเวลา 12/07/2562 - 21/04/2564
 แผนงาน 68.3 % ผลงาน 100 % รอบการรายงาน วันที่ 24 - สิ้นเดือน มิถุนายน 2563
 งวดงาน 57 สิ้นแล้ว 57

4



การสืบค้นข้อมูล โครงการ “แบบก่อสร้าง” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้


- 1) ปีงบประมาณ > เลือกปีงบประมาณ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 2) คำค้น > ใช้ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด ชื่อเฉพาะ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำชี
- 3) สถานะ > เลือกสถานะ (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียดโครงการ แบบก่อสร้าง

- 4) กดดาวน์โหลดแบบก่อสร้าง

เมนูย่อย 4. การส่งรายงานประจำสัปดาห์



รายงานการส่งงาน

1 ปีที่รายงาน -- ทั้งหมด --

2 ผู้ควบคุมงาน

3 เดือน สิงหาคม

4 ประเภทผู้ควบคุมงาน -- ทั้งหมด --

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จาก 381 รายการ

| ผู้ควบคุมงาน | วันที่ 1 - 7 | วันที่ 8 - 15 | วันที่ 16 - 23 | วันที่ 24 - สิ้นเดือน |
|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|
|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|

การสืบค้นข้อมูลโครงการ “การส่งรายงานประจำสัปดาห์” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- 1) ปีที่รายงาน > เลือกปีที่รายงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)
- 2) ผู้ควบคุมงาน > เลือกผู้ควบคุมงาน
- 3) เดือน > เลือกเดือน (เดือนปัจจุบัน เป็นค่าเริ่มต้น)
- 4) ประเภทผู้ควบคุมงาน > เลือกประเภทผู้ควบคุมงาน (ทั้งหมด เป็นค่าเริ่มต้น)

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด การส่งรายงานประจำสัปดาห์

เมนูย่อย 5. ค้างรายงาน



ค้างรายงาน

1 ปีที่รายงาน 2563 2 เดือน สิงหาคม

ค้นหา

แสดงรายการที่ 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ

| รายการ | วันที่ 1 - 7 | วันที่ 8 - 15 | วันที่ 16 - 23 | วันที่ 24 - ถึงสิ้นเดือน |
|--|--------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1. โครงการก่อสร้างเดือนปิดก่อนเดือนเริ่มปฏิทิน จำนวนหรือ 7 (วันที่ 2) ๑ บุรีรัมย์ (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2. เดือนปิดก่อนเดือนเริ่มปฏิทิน จำนวนหรือ ๔ (วันที่ ๔) ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวนหรือ ๑๖ (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3. เดือนปิดก่อนเดือนเริ่มปฏิทิน จำนวนหรือ ๘ (วันที่ ๘) ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวนหรือ ๑๖ (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4. เดือนปิดก่อนเดือนเริ่มปฏิทิน จำนวนหรือ ๑๐ (วันที่ ๑๐) ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวนหรือ ๑๖ (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5. เดือนปิดก่อนเดือนเริ่มปฏิทิน (ปิดเดือนก่อนสิ้น) จำนวนหรือ ๖ (วันที่ ๖) ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวนหรือ ๑๖ (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6. เดือนปิดก่อนเดือนเริ่มปฏิทิน (วันที่ 1) จำนวนหรือ ๒ (วันที่ ๒) ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวนหรือ ๑๖ (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7. (207-1/2560) โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ใน ระยะที่ 4 ๑ อุบลราชธานี (1) | ✓ | ✓ | ✓ | |

การสืบค้นข้อมูลโครงการ “ค้างรายงาน” ดังแสดงในตารางข้างบน ดังนี้

- 1) ปีที่รายงาน > เลือกปีที่รายงาน (ปีปัจจุบัน เป็นค่าเริ่มต้น)
- 2) เดือน > เลือกเดือน (เดือนปัจจุบัน เป็นค่าเริ่มต้น)

ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้ว

จะปรากฏรายละเอียด ค้างรายงาน

บทที่ 6

บทสรุป

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดการและการบริหารงานก่อสร้างทั้งในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองเอง รวมถึงโครงการที่ให้บริการด้านช่างกับหน่วยราชการอื่น ให้เป็นระบบ มีความแม่นยำ รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ผู้บริหารสามารถเข้าไปตรวจสอบในโครงการก่อสร้างที่มีปัญหา ทั้งปัญหาด้านการก่อสร้าง ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถเข้าไปดำเนินการมอบนโยบายและสั่งการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที การนำข้อมูลของโครงการก่อสร้างที่มีทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณตั้งแต่เริ่มวันเริ่มงานการก่อสร้างจนถึงวันที่ยานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ มารวมอยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปวิเคราะห์ คำนวณใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท ดังนี้

ด้านผู้บริหาร สามารถตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมของความก้าวหน้างานก่อสร้างของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ จำนวนงานที่ผลงานก่อสร้างเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด สาเหตุของความล่าช้าของงาน งานที่อยู่ระหว่างการแก้สัญญาจ้างพร้อมสาเหตุในการแก้สัญญา จำนวนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

ด้านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการที่ตนเองเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่ชื่อโครงการ ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง มูลค่าโครงการ สถานะโครงการ บันทึกการรายงานความก้าวหน้า รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงานในโครงการ รวมถึงสามารถติดตามเอกสารการอนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ และบันทึกการส่งงวดงานและเอกสารประกอบการส่งงานในแต่ละครั้งของการส่งงาน

ด้านผู้ควบคุมงาน สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ในการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง โดยสามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง รวมถึงสภาพแวดล้อม พร้อมรูปถ่ายความก้าวหน้างาน ให้เป็นไปตามหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากโทรศัพท์สมาร์ตโฟนของตนเองเข้าในระบบ ณ สถานที่ก่อสร้างได้ทันที และจากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้ควบคุมงานสามารถเปิดดู

แบบก่อสร้าง สัญญาจ้าง รายละเอียดของโครงการ จากโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องพกพาเอกสารจำนวนมาก

ด้านแอดมิน/ธุรการ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน แอดมิน/ธุรการ เช่น การเริ่มต้นนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้างโครงการ การตั้งรหัสผู้เข้าใช้สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และแอดมิน/ธุรการ การเพิ่มข้อมูลประเภทต่าง ๆ (เอกสารอนุมัติวัสดุ บริษัทผู้รับจ้าง ฯลฯ)

ในอนาคตหน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกองควบคุมการก่อสร้างที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละโครงการให้สอดคล้องต่อเนื่อง ไม่ทับซ้อนกับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และสามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษางานก่อสร้างที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาประกันผลงานของผู้รับจ้างต่อไป

ที่ปรึกษา

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความรู้ (CKO)

บรรณาธิการ

นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ (CKM Team)

นายชัยยา เจริญจิตรธรรม
ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง
คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team)

กองบรรณาธิการ

กองควบคุมการก่อสร้าง

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ๑. นายธงชัย ธนะดำรงชัยพร | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายไพรัตน์ ทรงเย็น | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายธิปภ ฝอยทอง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| ๔. นายพงศธร สิงห์เนี่ยว | พนักงานวิศวกรโยธา |
| ๕. นายวิศนันท วิชาชนสมบัติ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวยุพาทภรณ์ คำมะลิ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวรัสนันท์ คำศรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| ๑. นางสาวไพรินทร์ ดุราศวิน | หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประสานงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๒. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ | | |
| ๒.๑ นางสาวจิตกฤษ เปาประดิษฐ์ | | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒.๒ นางสาวอรอุมา อัจปิษา | | พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| ๒.๓ นางสาวอรณี มีสา | | พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |



ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT KM Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง

จัดทำโดย
กองควบคุมการก่อสร้าง
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระรามที่ ๖) ๐ ๒๒๙๙ ๔๐๐๐
www.dpt.go.th

